

Codice A1813B

D.D. 28 febbraio 2020, n. 440

D.P.C.M. 13 ottobre 2011 art. 11 - Monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con il "Fondo per le zone di confine per la promozione di aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale". Approvazione della rendicontazione finale del Traversella (TO).



ATTO N. DD-A18 440

DEL 28/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.C.M. 13 ottobre 2011 art. 11 – Monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con il “Fondo per le zone di confine per la promozione di aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale”. Approvazione della rendicontazione finale del Traversella (TO).

Vista la nota in data 19.10.2018 con la quale il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha incaricato il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino di effettuare il monitoraggio sotto il profilo tecnico mediante collaborazione con la Direzione Affari Costituzionali ed Avvocatura.

Esaminata la documentazione relativa alla rendicontazione trasmessa a questo Settore dal Comune di Traversella (TO) con nota in data 22.08.2019 prot. 1562: “Miglioramento della fruibilità turistico-ricettiva del Comune di Traversella (TO)”, per un importo complessivo del finanziamento concesso pari a €. 756.867,53;

esaminata tutta la documentazione trasmessa ed accertata la conformità delle dichiarazioni con quanto autorizzato dal Dipartimento per gli affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al momento della concessione del contributo e precisato che la valutazione consiste nella valutazione di quanto risultante dalla documentazione trasmessa e di quanto dichiarato dai responsabili dei lavori e dell’ente beneficiario del contributo sotto la propria esclusiva responsabilità;

esaminata la relazione di fine istruttoria redatta in data 25.02.2020 dall’ing. Ing. Riccardo Crivellari dipendente del Settore Tecnico Regionale di Torino a ciò incaricato ed allegata al presente atto con il n.1).

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

vista la nota in data 19.10.2018 con la quale il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha incaricato il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino di effettuare il monitoraggio sotto il profilo tecnico mediante collaborazione con la Direzione Affari Costituzionali ed Advocatura;

esaminata la relazione di fine istruttoria redatta in data 25.02.2020 dall'ing. Ing. Riccardo Crivellari dipendente del Settore Tecnico Regionale di Torino a ciò incaricato ed allegata al presente atto con il n.1), redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 22.10.2019 alla presenza dell'Assessore delegato, del Tecnico Comunale e del Direttore Lavori.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art.6 del D.L. 02.07.2007 n.81 convertito con modificazioni dalla legge 03.07.2007 n.127 con la quale è stato costituito il "Fondo per le zone di confine per la promozione di aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale";
- l'art. 11 del D.P.C.M. 12.10.2011 con il quale è stato affidato alle Regioni competenti, in accordo con il Dipartimento per gli affari regionali, il compito di effettuare il monitoraggio sui progetti realizzati con il fondo di che trattasi;
- il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali ed Autonomie Locali che ha emanato il bando disciplinante la ripartizione tra le varie macroaree delle risorse relative al "Fondo per le zone di confine per la promozione di aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale";
- la D.G.R. 06.03.2017 n. 4-4721 di approvazione delle direttive per lo svolgimento del monitoraggio in argomento che comporta l'accertamento dello stato di realizzazione del progetto finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato, il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché la verifica della rendicontazione delle spese a tal fine sostenute da realizzarsi mediante l'esame di autocertificazioni sottoscritte dal Sindaco, del Tecnico Comunale e del Direttore dei Lavori;

determina

1. di approvare la rendicontazione trasmessa a questo Settore dal Comune di Traversella (TO) relativa al progetto "Miglioramento della fruibilità turistico-ricettiva del Comune di Traversella (TO)"; per un importo complessivo di €. 756.867,53e finanziato ai sensi del "Fondo per le zone di confine per la promozione di aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano";
2. di attestare che dall'esame della documentazione trasmessa si evince il corretto utilizzo del contributo in conformità del progetto finanziato come evidenziato nella relazione di fine istruttoria

redatta in data 25.02.2020 dall'ing. Ing. Riccardo Crivellari dipendente del Settore Tecnico Regionale di Torino a ciò incaricato, ed allegata al presente atto con il n.1);

3. di precisare che il monitoraggio è stato effettuato secondo la D.G.R. 06.03.2017 n. 4-4721 di approvazione delle direttive per lo svolgimento del monitoraggio in argomento che comporta l'accertamento dello stato di realizzazione del progetto finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato, il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché la verifica della rendicontazione delle spese a tal fine sostenute;

4. di escludere la possibilità di sussistenza di cause di revoca totale o parziale del finanziamento oggetto del presente atto;

5. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento per gli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Direzione Affari Costituzionali ed Avvocatura ed al Comune di Traversella (TO).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi presso le sedi amministrative ed istituzionali secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Fto Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI TRAVERSELLA

DPCM 13 ottobre 2011, art. 11- “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”.

Esito delle attività di monitoraggio sotto il profilo tecnico affidato dalla Direzione Opere Pubbliche al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino con nota in data 19.10.2018 prot. 47332.

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Si premette che il D.P.C.M. sopraccitato ha stabilito le modalità di erogazione del predetto fondo nonché i criteri con cui finanziare le amministrazioni comunali interessate. Successivamente all'approvazione della graduatoria relativa alla denominata macroarea Valle D'Aosta il Comune di Traversella (TO) è risultato assegnatario della somma di €. 756.867,53 per il progetto denominato: **“Miglioramento della fruibilità turistico-ricettiva del Comune di Traversella (TO)”**.

§ 1) Obiettivi generali del progetto

L'amministrazione comunale di Traverella ha inteso effettuare alcuni interventi di miglioramento al fine di incrementare la fruibilità turistico-ricettiva della valle ed in particolare del concentrico comunale un tempo fiorente centro minerario; nello specifico gli interventi sono risultati diversi ed articolati sostanzialmente nei seguenti ambiti:

1) Intervento A

Realizzazione di un nuovo parcheggio a scopo turistico con ampliamento di piazzale ottenuto anche attraverso la realizzazione di nuovi muri di sottoscarpa realizzati con scogliere in massi. Il parcheggio ha lo scopo di permettere la manovra e la sosta dei bus di linea che raggiungono la valle. E' stato inoltre prevista la realizzazione di un servizio igienico in prossimità e due stalli con colonna di ricarica per auto elettriche.

2) Interventi B1 E B2

Sistemazione della piazza Cavour mediante realizzazione di una nuova viabilità che consenta l'accesso più agevole a locali comunali utilizzati come magazzino, anche in questo caso è stata realizzata una parziale sistemazione della piazza con parcheggi, ringhiere di protezione e nuovi muri di contenimento in c.a.

3) Interventi C1 e C2

Tali interventi sono sostanzialmente due lotti con i quali è stata completamente riqualificata l'illuminazione pubblica del concentrico comunale; gli interventi sono stati realizzati, su incarico dell'amministrazione, direttamente da Enel-Sole.

§ 2) Quadro economico

Dall'analisi della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'Amministrazione di Traversella (TO) e verificata in contraddittorio in sede di sopralluogo avvenuto il 21.10.2109 alla presenza del Tecnico Comunale, dell'Assessore competente e del Professionista incaricato della progettazione e della Direzione dei Lavori, e successivamente integrata a seguito di specifiche richieste di questo Settore, il quadro economico risulta così articolato:

<i>voci quadri economici</i>	<i>progetti definitivi al 21/12/2015</i>	<i>progetti esecutivi</i>	<i>aggiudicazione</i>	<i>perizia di variante</i>	<i>contabilità finale</i>
Intervento A - importo lavori		€ 498.000,00			
di cui soggetti a ribasso		€ 493.000,00	€ 328.061,92	€ 461.205,92	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.261,28	
TOTALE	€ 498.000,00	€ 498.000,00	€ 333.061,92	€ 474.467,20	€ 474.467,20
Intervento B1 - importo lavori		€ 39.870,22			
di cui soggetti a ribasso		€ 34.295,16	€ 31.894,50		
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.575,06	€ 5.575,06		
TOTALE	€ 50.000,00	€ 39.870,22	€ 37.469,56		€ 39.869,56
Intervento B2 - importo lavori		€ 19.079,37			
di cui soggetti a ribasso		€ 17.348,21	€ 17.001,25		
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.731,16	€ 1.731,16		
TOTALE		€ 19.079,37	€ 18.732,41		€ 18.732,41
Intervento C1 - importo lavori	€ 58.000,00	€ 26.800,00	€ 26.800,00		€ 26.800,00
Intervento C2 - importo lavori		€ 11.215,09	€ 11.215,09		€ 11.215,09
TOTALE COMPLESSIVO	€ 606.000,00	€ 594.964,68	€ 427.278,98	€ 474.467,20	€ 571.084,26
Somme a Disposizione					
Spese Generali intervento A					
Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 4.980,00	€ 4.980,00	€ 4.980,00	€ 7.063,45	€ 7.063,45
Spese tecniche	€ 49.644,71	€ 49.644,71	€ 51.844,71	€ 70.385,77	€ 70.385,77
Spese Generali intervento B1					
Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 500,00	€ 797,40	€ 797,40		€ 797,40
Spese tecniche	€ 4.502,48	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00

Spese Generali intervento B2					
Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.		€ 190,79	€ 190,79		€ 190,79
Spese tecniche		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese generali intervento C					
Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	€ 580,00				
Spese tecniche	€ 1.082,41				
Totale Spese Generali	€ 61.289,60	€ 63.612,90	€ 65.812,90	€ 77.449,22	€ 86.437,41
I.V.A. sui lavori intervento A	€ 49.800,00	€ 49.800,00	€ 33.306,19	€ 47.446,72	€ 47.446,72
I.V.A. sui lavori intervento B1	€ 5.000,00	€ 3.987,02	€ 3.746,96		€ 3.986,96
I.V.A. sui lavori intervento B2		€ 1.907,94	€ 1.873,24		€ 1.873,24
I.V.A. sui lavori intervento C1 (aumento iva dal 21 al 22%)	€ 12.180,00	€ 5.628,00	€ 5.628,00		€ 5.896,00
I.V.A. sui lavori intervento C2 (in parte al 10 e in parte al 22%)		€ 1.310,75	€ 1.310,75		€ 1.310,75
CNPAIA 4% su spese tecniche intervento A	€ 1.985,79	€ 1.985,79	€ 2.073,79	€ 2.815,43	€ 2.815,43
I.V.A. su spese tecniche	€ 10.842,40	€ 10.842,40	€ 11.322,88	€ 16.104,26	€ 16.104,26
CNPAIA 4% su spese tecniche intervento B1	€ 180,10	€ 200,00	€ 200,00		€ 200,00
I.V.A. su spese tecniche	€ 983,34	€ 1.144,00	€ 1.144,00		€ 1.144,00
CNPAIA 4% su spese tecniche intervento B2		€ 120,00	€ 120,00		€ 120,00
I.V.A. su spese tecniche		€ 686,40	€ 686,40		€ 686,40
CNPAIA 4% su spese tecniche intervento C	€ 43,30				
I.V.A. su spese tecniche	€ 236,40				
Fondi in amministrazione diretta e per imprevisti intervento A	€ 6.842,65	€ 6.842,65	€ 6.842,65	€ 3.812,71	€ 3.812,71
Fondi in amministrazione diretta e per imprevisti intervento B1	€ 687,01	€ 1.001,35	€ 1.001,35		
Fondi in amministrazione diretta e per imprevisti intervento B2		€ 15,50	€ 15,50		
Fondi in amministrazione diretta e per imprevisti intervento C	€ 796,94				
Totale Somme a Disposizione	€ 150.867,52	€ 149.084,70	€ 135.084,61	€ 147.628,34	€ 171.833,88
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 756.867,52	€ 744.049,38	€ 562.363,59	€ 622.095,54	€ 742.918,14
				ECONOMIE	€ 13.949,38

Si prende atto che:

1) il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con propria nota in data 12.02.2019 prot. 2470 ha autorizzato il Comune di Traversella (TO)

all'utilizzo della somma di €. 13.949,39 derivante dalle economie residue che sono state impiegate per l'acquisto di arredi urbani così come risulta dalle fatture regolarmente visionate in sede di sopralluogo;

2) la relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione, per l'intervento A, sono stati redatti in data 22.06.2019;

3) la relazione sul conto finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione, per l'intervento B1-B2, sono stati redatti in data 27.06.2019;

4) che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve.

§ 3) Verifica in loco e conformità delle opere, andamento dei lavori

A seguito dell'incarico ricevuto di monitoraggio sotto il profilo tecnico affidato dalla Direzione Opere Pubbliche al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino con nota in data 19.10.2018 prot. 47332 si è provveduto ad effettuare la verifica in loco degli interventi eseguiti in data 22.10.2019 alla presenza dell'Assessore competente, del Tecnico Comunale e del Professionista incaricato della progettazione e della Direzione Lavori constatando che i lavori sono conclusi e conformi al progetto precedentemente esaminato. In corso di sopralluogo si è infine accertato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni temporanee di terreni e fabbricati, e pertanto non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum, a norma della vigente Legge sui lavori pubblici.

Sulla base di quanto sopra descritto si certifica pertanto che le opere in questione sono state regolarmente eseguite nel rispetto delle vigenti normative.

§ 4) Raggiungimento degli obiettivi

A conclusione dell'istruttoria si evidenzia che con il progetto di che trattasi l'amministrazione è certamente intervenuta per potenziare tutte le strutture ritenute di vitale importanza per il miglioramento della fruibilità turistica. Il progetto, suddiviso in tre interventi correlati fra loro da un unico filo conduttore, finalizzato alla riqualificazione ed alla nuova realizzazione di interventi migliorativi per la viabilità ed alla riqualificazione dell'illuminazione del concentrico nonché alla migliore fruibilità di alcuni locali comunali esistenti, **ha raggiunto gli obiettivi prefissati migliorando i servizi di fruibilità turistica.**

Torino, 25.02.2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Ing. Riccardo CRIVELLARI)

firmato digitalmente

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. For. Elio PULZONI)

firmato digitalmente


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ACQUISITA IN SEDE DI SOPRALLUOGO



1., edificio servizi igienici, stalli ricarica auto elettriche



2. Intervento A Nuovo parcheggio bus

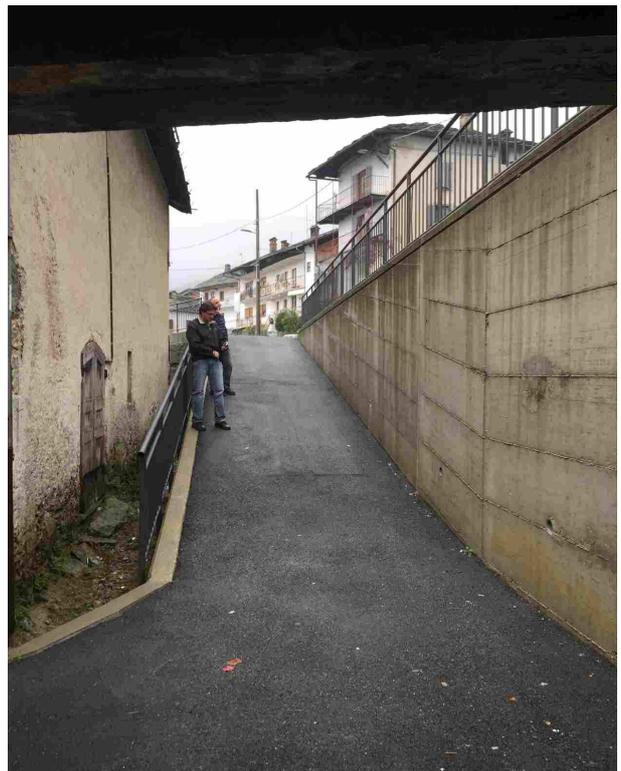

3-4 Muro contenimento P.za Cavour accesso a magazzino comunale



5 Riqualificazione Piazza Cavour



6 Nuovo impianto illuminazione pubblica



7 Parte dei nuovi arredi urbani
