



ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
LA REGIONE PIEMONTE

**Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del Decreto-legge
124/2023 e dell'art. 5, comma 2 dell'Accordo**

SEMESTRE
dal 1° gennaio al 30 giugno 2026

INDICE

Premessa.....	3
Primi adempimenti.....	5
Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV).....	7
Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo	14
1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (<i>Delibera CIPESS numero 27, del 23 aprile 2024</i>).....	14
2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021.....	33
Piano di comunicazione e buone prassi.....	37

Premessa

L'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte è stato sottoscritto il 7 dicembre 2023, recepito con la Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 “Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023”.

La Delibera CIPESS n. 27/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 06-08-2024.

Il valore complessivo dell'Accordo ammonta a 865.305.613,19 euro, di cui 125.353.922,91 assegnate da delibera CIPESS 79/2021 (anticipazione), 694.215.368,32 provenienti da delibera CIPESS 25/2023 (ordinarie) e 45.736.321,96 derivano da diversi cofinanziamenti (PSC Piemonte, PNRR, risorse ordinarie nazionali, regionali e locali). Una quota dell'assegnazione FSC ordinaria, pari a 170.000.000, è stata destinata al cofinanziamento regionale del PR FESR Piemonte (ai sensi dell'art. 23, c. 1-ter, DL 152/2021).

Con la Deliberazione CIPESS n. 11/2026, recante «FSC 2014-2020 e precedenti: Piani sviluppo e coesione (PSC), Regione Lazio, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento. Attuazione dell'articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. FSC 2021-2027: incremento dell'imputazione programmatica», è stato disposto il defianziamento delle risorse FSC della Sezione speciale 2 del PSC della Regione Piemonte, per l'importo di 241.983.263,00 euro, con contestuale incremento, per il medesimo importo, dell'imputazione programmatica a valere sul FSC 2021-2027. La medesima delibera prevede che tali risorse siano successivamente finalizzate, con apposita deliberazione CIPESS, nell'ambito dell'Accordo per la coesione, andando ad incrementare la dotazione finanziaria dell'Accordo stesso.

Il sistema di governance dell'Accordo poggia su un Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza composto da quattro componenti: un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante della Regione Piemonte.

In ordine agli organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell'Accordo, fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell'Accordo è svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, sono stati individuati: come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”; come Organismo di Certificazione, il Settore regionale “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie”; come referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, “FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo”).

I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo sono stati approvati il 7 ottobre 2024 (D.D. 308/A2104B/2024), rispettando i tempi previsti dall'Accordo. Successivamente, nel mese di novembre 2025, tali documenti sono stati aggiornati (D.D. 253/A2104C/2025). La documentazione è disponibile sul sito istituzionale della Regione, a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/sistema-gestione-controllo-accordo-per-coesione-fsc-2021-2027>

Primi adempimenti

La tabella sottostante illustra la distribuzione delle risorse dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, articolate per ambiti di intervento e fonti di finanziamento. L'investimento complessivo, inclusa la quota destinata al PR FESR Piemonte, è di 865,3 milioni di euro.

Quadro finanziario complessivo

Tabella art. 3 Accordo per la coesione Regione Piemonte									
AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	T totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	T totale Cofinanziamento con altre risorse (*)	
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00
Riqualificazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72
Totale Ambiti di Intervento	125.353.922,91	524.215.368,32	649.569.291,23	199.034,40	2.000.000,00	20.281.665,41	23.255.622,15	45.736.321,96	695.305.613,19
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00
Totale Generale	125.353.922,91	694.215.368,32	819.569.291,23						865.305.613,19

(*) L'importo è comprensivo del cofinanziamento degli interventi inseriti nelle anticipazioni.

Le risorse provenienti da fonti diverse dal FSC ammontano complessivamente a 45.736.321,96 euro. Tali risorse, già indicate nell'Accordo, risultano confermate, come comunicato nella nota del 31 ottobre 2024 (Oggetto: Accordo per la coesione Regione Piemonte. Riscontro primi adempimenti), trasmessa in risposta alla richiesta del 25 ottobre scorso e successivamente ribadito nella relazione semestrale di monitoraggio (gennaio – giugno 2025). Nel corso dell'attuazione, l'ammontare complessivo dei cofinanziamenti potrà tuttavia aumentare in seguito ad eventuali nuovi apporti finanziari conferiti dai soggetti beneficiari.

Con la medesima nota del 31 ottobre 2024 si dava inoltre conferma che tutte le linee di azione erano state avviate. In particolare, nel mese di settembre 2024 si è provveduto ad individuare i Responsabili regionali di attuazione e controllo per tutte le linee di azione e gli interventi indicati nell'Accordo per la Coesione (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Per quanto riguarda le attività di selezione degli interventi, si segnala che questa fase procedurale è stata completata per le **risorse FSC assegnate in anticipazione**; tutti gli interventi hanno raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2024 e il processo di attuazione procede regolarmente. Al 30 giugno 2026 si registrano pagamenti FSC per circa 78,6 milioni, pari al 62,7% delle risorse assegnate.

Per quanto riguarda le **risorse FSC assegnazione ordinaria** si evidenzia che tutte le aree tematiche e relative linee di intervento sono state attivate (si veda il focus sulle assegnazioni). Anche per questa componente si registra un'evoluzione positiva sul piano attuativo. Il numero di interventi selezionati e identificabili con codice CUP è pari a 1.313, erano 1.064 a giugno 2025 e 46 a dicembre 2024. Analoga crescita anche sul versante finanziario. Al 30 giugno 2026, gli impegni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ammontano a 296,6 milioni di euro, pari al 56,5% delle risorse assegnate, con un incremento significativo rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2025 (254,2 milioni di euro). Un progresso rilevante si osserva anche sul fronte dei pagamenti, che si attestano a 79,1 milioni di euro — a fronte dei 51,8 milioni registrati alla fine dello scorso anno — corrispondenti a circa il 15% delle risorse FSC complessivamente disponibili.

Per quanto riguarda l'attuazione delle Linee di Azione, si è provveduto a compilare la tabella richiesta, riportando per ciascuna di esse le informazioni riguardanti l'avvio, la conclusione e l'esito delle relative procedure.

Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV)

Il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza è composto da:

- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante della Regione Piemonte.

Il responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo è individuato nel Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Si sono finora avanzate quattro richieste di modificazione.

Con la **prima**, trasmessa con nota prot. 7210 del 16 aprile 2024, il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto al Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR", la modifica degli allegati all'Accordo, resasi necessaria in seguito allo spostamento, dall'Allegato A2 all'Allegato A1 dell'Accordo stesso, degli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata con le risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023, pari complessivamente a 6.659.743,44.

Con nota n. 7104 del 17 aprile 2024 il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, pur non comportando tali modifiche variazioni sostanziali ai contenuti dell'Accordo, ha sottoposto detta richiesta al Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza che non ha avanzato osservazioni al riguardo.

Con la **seconda** richiesta, formalizzata con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00050306 del 20 novembre 2024, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la proposta di attivazione della procedura di modifica del cronoprogramma dell'Accordo per la Coesione in ragione delle tempistiche intercorse tra la programmazione e l'effettiva assegnazione delle risorse, avvenuta soltanto in data 6 agosto 2024 con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0023675-P-10/12/2024 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, che in data 20 dicembre 2024 si è riunito per la relativa disamina.

Con nota prot. n. 55797 del 31 dicembre 2024, il Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, inviando i nuovi allegati A1, B1 e B2 e la conferma dell'allegato A2 invariato.

Con la **terza**, trasmessa con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00007765 del 21 febbraio 2025, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la richiesta di attivazione della procedura scritta per la proposta di modifica degli allegati all'Accordo relativamente alla linea di azione FSCRI_RI_147. Tale modifica è risultata necessaria per ottimizzare le opzioni di scelta dei progetti da attivare, rendendo più efficace la selezione dei progetti strategici, di rilevanza regionale e nazionale, ricadenti nella suddetta linea

d'azione. Si è confermato l'importo complessivo delle risorse assegnate alla linea d'azione, pari a 60 milioni di euro.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0003435-P-24/02/2025 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, al quale si è chiesto di far pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre venerdì 28 febbraio 2025, con il meccanismo del silenzio assenso. In assenza di osservazioni, la proposta è stata positivamente accolta.

Infine, con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00055942 del 21 novembre 2025, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR una **quarta** proposta di modifica" con contestuale richiesta di attivazione della procedura scritta. In particolare, si proponevano due modifiche:

- 1) Variazione del cronoprogramma di spesa, per impossibilità oggettiva di rispettare le previsioni per cause non imputabili all'amministrazione regionale o al soggetto attuatore. Le modifiche riguardavano una linea d'azione e sei interventi.
- 2) L'aggiornamento della denominazione di una linea d'azione prevista in fase di sottoscrizione dell'Accordo.

Successivamente, in data 29 dicembre 2025, la Conferenza Stato Regioni - rilevata la necessità di consentire uno slittamento dei piani finanziari degli Accordi per l'annualità 2025, in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei, nonché degli impegni assunti nella medesima Intesa - ha proposto di procedere alle modifiche dei piani finanziari mediante opportuni confronti bilaterali, nel rispetto delle vigenti procedure di modifica degli Accordi.

Si è pertanto richiesto alle Amministrazioni competenti, ove necessario, di attivare la procedura di modifica degli Accordi attraverso apposita richiesta del Presidente di Regione o Provincia autonoma al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione. Per le Amministrazioni che avessero già trasmesso proposte di modifica dei cronoprogrammi degli Accordi è stato indicato di confermare i termini delle stesse o, in alternativa, di inviare una richiesta aggiornata (Nota DPCOE N. 1403-P-27.01.2026). In riscontro a tali indicazioni, il Presidente della Regione Piemonte ha trasmesso una prima **integrazione alla quarta proposta** di modifica (nota prot. n. P 00000034 del 13/02/2026), successivamente integrata alla luce dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente misure per sostenere la priorità Housing nonché in attuazione del Decreto Legge n. 19/2026, di cui all'art. 1 comma 3. Con tale ultima nota si è trasmesso: il nuovo piano finanziario di spesa, allineato con le risultanze del monitoraggio extra-sistema (aggiornato al 31 dicembre 2025); la richiesta di modifica del titolo e della descrizione di una linea di azione, ad importi invariati, al fine di ottimizzare le opzioni di scelta dei progetti strategici da attivare; la relazione descrittiva delle motivazioni sottese alla variazione del cronoprogramma per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Con nota DPCOE prot. n. 0012071-P del 12 giugno 2026, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, in esito all'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione, nell'ambito della quale è stato acquisito il prescritto parere del Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza.

Si riportano le tabelle risultanti, opportunamente aggiornate alla luce di quanto sopra citato.

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE	
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72	-	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE – Settore Sport e Tempo libero – I beneficiari saranno individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica o tramite procedure negoziate	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, Intese, Accordi o altri strumenti tra amministrazioni pubbliche	60.000.000,00	60.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	1_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE e Enti sottoscrittori Accordi di Programma ai sensi art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDONECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34J24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2028	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_27	TRENITALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J69B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00	-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_542	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE,TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2029	1_SEMESTRE_2031
PIE#ORD#0001	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
PIE#ORD#0002	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028
PIE#ORD#0003	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2027	2_SEMESTRE_2030
PIE#ORD#0004	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2030
PIE#ORD#0005	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029
PIE#ORD#0006	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 "Castello D'Annone – Nizza Monferrato" - Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2027

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte
Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27

ID	AreaTematica	Linea di Intervento	Cup	Titolo	Importo FSC 21-27 (anticipazione)
PIE#ANT#0001	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	B35I18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	82.946,62
PIE#ANT#0002	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	34.702,26
PIE#ANT#0003	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	19.072,90
PIE#ANT#0004	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96
PIE#ANT#0005	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	316.838,95
PIE#ANT#0006	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79
PIE#ANT#0007	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	67.628,93
PIE#ANT#0008	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50
PIE#ANT#0009	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	844.560,00
PIE#ANT#0010	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo	32.343,00
PIE#ANT#0011	05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero Frazione San Bovo	13.000,00
PIE#ANT#0012	05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00
PIE#ANT#0013	05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00
PIE#ANT#0014	05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00
PIE#ANT#0015	03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00
PIE#ANT#0016	03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00
PIE#ANT#0017	03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed ent ipubblici che gestiscono impianti sciistici	1.000.000,00
PIE#ANT#0018	03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00
PIE#ANT#0019	06.Cultura	ATTIVITA' CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00
PIE#ANT#0020	02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00
PIE#ANT#0021	02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00
PIE#ANT#0022	11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP	35.992.650,00
PIE#ANT#0023	11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00
PIE#ANT#0024	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00
PIE#ANT#0025	06.Cultura	PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte
 Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell'Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Cronoprogramma FSC 21-27	1.465.312,80	50.344.370,90	60.763.083,73	106.642.498,84	94.122.400,24	98.617.902,42	70.432.678,11	41.827.121,28	524.215.368,32

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Nuovo Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00		0,00		16.118.747,48	1.502.340,92	14.241.561,20	10.892.847,20	34.384.161,20	43.000.000,00	20.351.656,00
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00	-	0,00		15.957.792,15	14.042.207,85	15.696.321,00	2.000.000,00			
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00	-	0,00		2.156.719,73		3.843.280,27	5.000.000,00	10.812.365,00	2.000.000,00	
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72	-	0,00		15.713,64	180.000,00	470.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	1.305.134,08
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE – Settore Sport e Tempo libero – I beneficiari saranno individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica o tramite procedure negoziate	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando, Intese, Accordi o altri strumenti tra amministrazioni pubbliche	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00		841.382,07	2.858.617,93	6.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.300.000,00
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40	0,00			788.482,80	788.482,80				
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00	-	0,00		118.936,02		119.363,98		230.000,00		
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00	-	0,00		65.379,42	184.620,58	50.000,00				
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE e Enti sottoscrittori Accordi di Programma ai sensi art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00	0,00	1.265.312,80	3.543.394,06	3.191.293,14	9.000.000,00	9.000.000,00	4.249.287,56	1.500.000,00	
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDONECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34J24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	-	0,00	200.000,00	1.154.165,14	219.434,86	600.000,00	600.000,00			
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00		500.446,30		299.553,70	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00	0,00		9.710.791,80	20.789.208,20	25.000.000,00	30.000.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	
FSCRI_RI_27	TRENITALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J69B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00	-	0,00		0,00		13.021.987,20	14.107.152,80	14.107.152,80		2.170.331,20
FSCRI_RI_542	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE,TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00		0,00			500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
PIE#ORD#0001	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00				0,00				1.300.000,00		
PIE#ORD#0002	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00			
PIE#ORD#0003	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
PIE#ORD#0004	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56	0,00		0,00	305.071,24	610.142,49	610.142,49	762.678,11	762.678,11	
PIE#ORD#0005	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00	0,00		40.903,10	81.806,20	81.806,20	102.257,75	102.257,75		
PIE#ORD#0006	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 “Castello D'Annone – Nizza Monferrato” - Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rochetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00		120.000,00	420.000,00	420.000,00	240.000,00			

Tabella art. 3 Accordo per la coesione Regione Piemonte										
AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti	Numero interventi/ linee di azione
	(1) Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Co-finanziamento con altre risorse (*)		
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00	2
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00	5
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00	1
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91	14
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00	3
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00	5
Riqualficazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56	9
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00	2
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00	2
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72	1
Totale Ambiti di Intervento	125.353.922,91	524.215.368,32	649.569.291,23	199.034,40	2.000.000,00	20.281.665,41	23.255.622,15	45.736.321,96	695.305.613,19	44
Cofinanziamento PR (ove applicabile)		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00	
Totale Generale	125.353.922,91	694.215.368,32	819.569.291,23						865.305.613,19	

Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo

Il percorso di attuazione dei programmi e degli interventi previsti dall'Accordo per la Coesione prosegue regolarmente, sia per la componente ordinaria sia per la parte finanziata mediante anticipazioni. Con riferimento a quest'ultima, si ribadisce che tutti gli interventi hanno rispettato i termini stabiliti per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) alla data del 31 dicembre 2024.

1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (Delibera CIPESS numero 27, del 23 aprile 2024)

La tabella che segue riporta lo stato di attuazione delle risorse ordinarie nell'ambito dell'Accordo di Coesione. Il costo totale registrato dal sistema di monitoraggio è pari a 570,8 milioni, importo superiore a quello previsto nel Accordo vigente (567,3 milioni). Tale differenza è riconducibile a risorse integrative conferite dai soggetti beneficiari, aggiuntive rispetto a quanto concordato, destinate in massima parte a far fronte all'incremento dei prezzi delle materie e prime e dei materiali da costruzione. Per quanto concerne le risorse FSC, le risorse registrate nel sistema di monitoraggio si attestano a 469,9 milioni, con uno scostamento di circa 54,3 milioni rispetto alle risorse FSC assegnate che ammontano a 524,2 milioni di euro. Tale scostamento è dovuto al perfezionamento della fase di assunzione degli impegni, ancora in corso in alcuni settori (Efficienza energetica, Edilizia e spazi pubblici, Strutture e attrezzature sanitarie). Si segnala, per contro, il pieno allineamento tra risorse assegnate e monitorate nei restanti settori, a conferma del progressivo consolidamento della fase di piena entrata a regime del programma

Sotto il profilo finanziario, alla data del 30 giugno 2026, gli impegni a valere sulle risorse FSC ammontano complessivamente a circa 296,6 milioni di euro, pari al 56,6 per cento delle disponibilità FSC, mentre i pagamenti si attestano a 79,2 milioni di euro, corrispondenti al 15 per cento circa delle risorse FSC programmate.

L'analisi disaggregata per area tematica evidenzia un andamento differenziato tra la fase di impegno e quella di effettiva erogazione della spesa, riconducibile alle diverse tempistiche attuative e alla natura degli interventi finanziati.

Alcune aree tematiche presentano un grado di impegno delle risorse particolarmente elevato, a fronte del quale si registra un avanzamento dei pagamenti modesto o del tutto assente. È il caso dell'area "Competitività Imprese", che presenta un tasso di impegno pari al 100 per cento delle risorse programmate a fronte di pagamenti non ancora avviati, e dell'area "Trasporti e Mobilità", con impegni pari al 96,6 per cento delle disponibilità – trainati in particolare dal sotto-settore "Trasporto Ferroviario", integralmente impegnato – a cui corrisponde una quota di pagamenti estremamente contenuta (0,6 per cento). Questo dato è legato alla natura degli interventi finanziati (fornitura autobus e treni) i cui pagamenti seguono logiche diverse rispetto alla realizzazione dei lavori pubblici, con la formalizzazione dell'acquisto si raggiunge immediatamente l'importo target.

Un andamento relativamente più equilibrato tra le due fasi della spesa si riscontra nell'area "Sociale e Salute" (impegni al 40,4 per cento e pagamenti al 26,7 per cento) e nell'area "Energia" (impegni al 16,2 per cento e pagamenti al 7,5 per cento), mentre un divario più marcato si osserva per l'area "Capacità Amministrativa" (impegni al 33,7 per cento e pagamenti al 5,3 per cento).


Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione finanziario (30/06/2026)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE		di cui:		IMPEGNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	n°
	ACCORDO VIGENTE	MONITORAGGIO	FSC 21-27 ASSEGNATO	FSC 21-27 MONITORAGGIO	FSC 21-27	%	FSC 21-27	%	INTERV.
			a		b	c=b/a	d	e=d/a	
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0%		0,0%	1
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0%		0,0%	1
04-ENERGIA	23.812.365,00	15.530.856,41	23.812.365,00	14.555.510,96	3.861.423,80	16,2%	1.791.364,08	7,5%	26
04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	23.812.365,00	15.530.856,41	23.812.365,00	14.555.510,96	3.861.423,80	16,2%	1.791.364,08	7,5%	28
06-CULTURA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	502.921,30	5,0%	502.921,30	5,0%	1
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	502.921,30	5,0%	502.921,30	5,0%	1
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	77.394.624,00	88.894.624,00	50.066.367,44	50.066.367,44	48.365.027,22	96,6%	300.301,98	0,6%	5
07.01-TRASPORTO STRADALE	33.988.000,00	45.488.000,00	6.659.743,44	6.659.743,44	4.958.403,22	74,5%	300.301,98	4,5%	4
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	43.406.624,00	43.406.624,00	43.406.624,00	43.406.624,00	43.406.624,00	100,0%		0,0%	1
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	221.967.187,56	252.943.911,53	208.168.153,16	195.887.665,96	126.607.464,93	60,8%	26.237.130,44	12,6%	933
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	221.967.187,56	252.943.911,53	208.168.153,16	195.887.665,96	126.607.464,93	60,8%	26.237.130,44	12,6%	933
10-SOCIALE E SALUTE	188.187.635,00	157.481.712,01	188.187.635,00	155.418.943,31	75.934.950,01	40,4%	50.155.167,98	26,7%	346
10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	188.187.635,00	157.481.712,01	188.187.635,00	155.418.943,31	75.934.950,01	40,4%	50.155.167,98	26,7%	346
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	3.980.847,72	3.980.847,72	3.980.847,72	3.980.847,72	1.341.896,09	33,7%	212.452,67	5,3%	1
12.02-ASSISTENZA TECNICA	3.980.847,72	3.980.847,72	3.980.847,72	3.980.847,72	1.341.896,09	33,7%	212.452,67	5,3%	1
TOTALE COMPLESSIVO	567.342.659,28	570.831.951,67	524.215.368,32	469.909.335,39	296.613.683,35	56,6%	79.199.338,45	15,1%	1.313

Si segnala infine l'area "Riqualificazione Urbana", che presenta il volume di impegni più elevato in termini assoluti tra tutte le aree considerate, pari a oltre 126 milioni di euro (60,8 per cento delle disponibilità), a fronte di pagamenti pari a 26,2 milioni di euro, corrispondenti al 12,6 per cento delle risorse programmate.

Il grafico sottostante evidenzia il significativo incremento registrato nei diversi semestri di riferimento. Nell'arco degli ultimi 18 mesi, gli impegni sono passati da 46,1 milioni di euro a 296,6 milioni di euro, con una crescita di circa 42,4 milioni di euro nel solo ultimo semestre (gennaio-giugno 2026). Analogamente, i pagamenti registrano una crescita consistente, passando da 2,2 milioni di euro a oltre 79,1 milioni di euro nel periodo considerato, con un incremento di 27,3 milioni di euro nell'ultimo semestre, segnalando una netta accelerazione nella fase di realizzazione degli interventi.

Accordo di Coesione – Risorse ordinarie – Impegni e Pagamenti

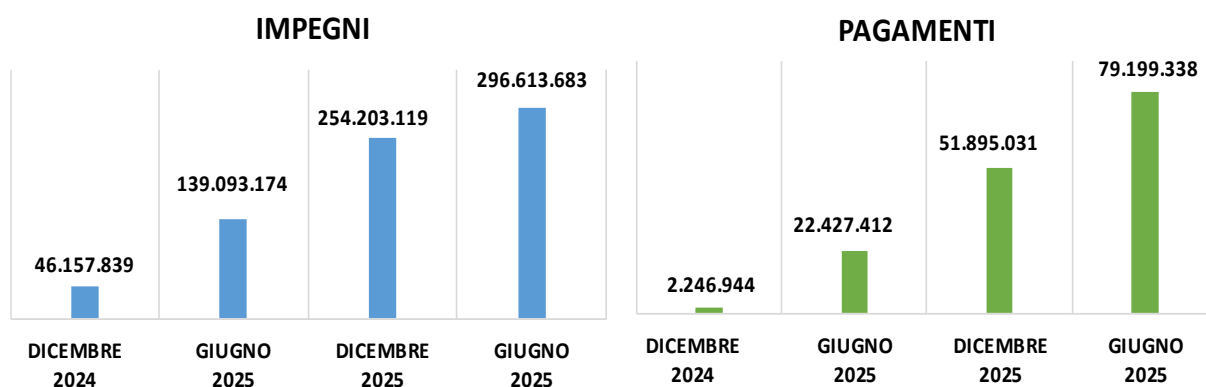

È opportuno segnalare come il significativo progresso registrato nell'utilizzo delle risorse sia stato realizzato in un contesto non particolarmente favorevole. Come rilevato anche dalla Conferenza Stato Regioni (29 dicembre 2025), alcuni interventi avviati nell'ambito dell'Accordo sono negativamente condizionati, sotto il profilo dei tempi di attuazione e dell'avanzamento finanziario, dalla concomitanza con i lavori previsti dal PNRR, soggetti a regole e scadenze particolarmente stringenti per la conclusione delle opere. Più in generale, la presenza simultanea, nelle agende finanziarie delle amministrazioni competenti, di molteplici programmi di investimento in corso di attuazione (PNRR, POC, Accordo di Coesione, programmi strutturali europei) può generare un sovraccarico operativo per le strutture attuative, oltre a introdurre rigidità nella gestione di cassa all'interno dei bilanci, riconducibili alla sostanziale impossibilità ad anticipare le risorse necessarie per i pagamenti.

Infine, per quanto riguarda le previsioni finanziarie, il piano di spesa per annualità riportato nell'Accordo vigente prevede, per le risorse ordinarie, un obiettivo di spesa complessiva pari a 112.572.767,43 euro da conseguire entro il 31 dicembre 2026. Al monitoraggio intermedio del 30 giugno 2026, la spesa realizzata ammonta a 79.199.338,45 euro, a fronte della quale residuano 33.373.428,98 euro da conseguire per il raggiungimento del target annuale.

L'analisi disaggregata per linea d'azione e interventi evidenzia andamenti differenziati. La linea relativa al Potenziamento e all'efficientamento della medicina territoriale e ospedaliera presenta una spesa conseguita di 29,1 milioni di euro a fronte di un target annuale di 17,6 milioni, segnalando il superamento dell'obiettivo di fine anno già in sede di monitoraggio intermedio.

Un andamento sostanzialmente coerente con la programmazione si registra per l'Ammodernamento del parco tecnologico sanitario, per il quale la spesa realizzata (21,1 milioni di euro) corrisponde al 70,2% del target di 30 milioni, in linea con l'andamento medio del programma. Analogo giudizio vale per l'Avviso 2023-2025 relativo al finanziamento degli Accordi di Programma, che a fronte di un target di 8 milioni di euro registra una spesa di 6 milioni, pari al 75%, e per la Riqualificazione energetica delle strutture sanitarie, che con 1,79 milioni di euro conseguiti sul target di 2,16 milioni raggiunge un avanzamento dell'83,1%.

Le Strategie territoriali d'area omogenea registrano una spesa di 17,6 milioni di euro a fronte di un target di 30,5 milioni per fine anno, corrispondente al 57,8%; la spesa aggiuntiva da realizzare entro fine anno ammonta a circa 12,9 milioni di euro.

Due linee di azione presentano un avanzamento di spesa inferiori alla media. Sviluppo e riqualificazione degli sport montani registra una spesa di 1,07 milioni di euro a fronte di un target di 3,7 milioni delle previsioni per fine anno. L'attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria non registra alcuna spesa conseguita alla data del 30 giugno 2026; in quest'ultimo caso, le ragioni di questo andamento sono legate alla natura dell'intervento finanziato (acquisto forniture), come meglio descritto oltre.

Nel complesso, il quadro generale evidenzia un livello di spesa in linea con le attese di metà periodo (giugno 2026).

ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - REGIONE PIEMONTE -- AVANZAMENTO DELLA SPESA

ID	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21- 27	SPESA OBIETTIVO 2024	SPESA OBIETTIVO 2025	SPESA OBIETTIVO 2026	SPESA OBIETTIVO TOTALE 2026	SPESA CONSEGUITA AL 30/06/2026	DIFFERENZA SPESA MONITORATA – SPESA OBIETTIVO
					A	B	C	D=A+B+C	E	F=E-D
FSCRI_RI_1232	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00		16.118.747,48	1.502.340,92	17.621.088,40	29.099.931,43	11.478.843,03
FSCRI_RI_1234	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00		15.957.792,15	14.042.207,85	30.000.000,00	21.055.236,55	-8.944.763,45
FSCRI_RI_1235	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00		2.156.719,73		2.156.719,73	1.791.364,08	-365.355,65
FSCRI_RI_13	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72		15.713,64	180.000,00	195.713,64	212.452,67	16.739,03
FSCRI_RI_147	LINEA D'AZIONE	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO, INTESE, ACCORDI O ALTRI STRUMENTI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.000.000,00	60.000.000,00		841.382,07	2.858.617,93	3.700.000,00	1.070.668,00	-2.629.332,00
FSCRI_RI_174	J22H2300240006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60			788.482,80	788.482,80	2.505,38	-785.977,42
FSCRI_RI_176	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00		118.936,02		118.936,02	119.228,82	292,80
FSCRI_RI_181	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00		65.379,42	184.620,58	250.000,00	68.551,42	-181.448,58
FSCRI_RI_182	LINEA D'AZIONE	FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DA ATTUARSI TRAMITE AVVISI, BANDI E PROCEDURE NEGOZiate	34.849.287,56	31.749.287,56	1.265.312,80	3.543.394,06	3.191.293,14	8.000.000,00	5.997.857,99	-2.002.142,01
FSCRI_RI_193	C34J24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	200.000,00	1.154.165,14	219.434,86	1.573.600,00	1.354.165,14	-219.434,86
FSCRI_RI_201	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00		500.446,30		500.446,30	502.921,30	2.475,00
FSCRI_RI_25	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00		9.710.791,80	20.789.208,20	30.500.000,00	17.624.153,69	-12.875.846,31
FSCRI_RI_27	J69B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00		0,00		0,00		0,00
FSCRI_RI_542	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE,TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00
NUOVO	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00		0,00		0,00
	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITA DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00		-16.000.000,00
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00		0,00	200.000,00	200.000,00	126.558,14	-73.441,86
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44		0,00	305.071,24	305.071,24	0,00	-305.071,24
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00		40.903,10	81.806,20	122.709,30	40.903,10	-81.806,20
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	J47H20000060003	S.P. 27 “Castello D’Annone – Nizza Monferrato” - Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00		120.000,00	420.000,00	540.000,00	132.840,74	-407.159,26
		TOTALE COMPLESSIVO	567.342.659,28	524.215.368,32	1.465.312,80	50.344.370,90	60.763.083,73	112.572.767,43	79.199.338,45	-33.373.428,98

1.1 Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione procedurale

In questo paragrafo si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti principali, e relativo stato di attuazione procedurale, delle linee di azione attivate.

COMPETITIVITA' IMPRESE

Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria: incentivi per il rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi

Costo totale: 40.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 40.000.000 – CUP J69B24000210001

Questa area tematica comprende un'unica linea d'intervento volta a favorire la rapida sostituzione degli autobus più inquinanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) con veicoli a minore impatto ambientale. L'intervento utilizza i criteri e i metodi di cui alla DGR 12-345/2024/XII dell'8 novembre 2024, recante disposizioni per il periodo 2024-2033 relative agli investimenti sul trasporto pubblico locale su gomma, in coerenza con la D.G.R. n. 8-220 del 4 ottobre 2024, ai fini di ottemperare alle previsioni del piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con D.C.R. n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, di sostituzione di almeno 100 autobus dando la priorità a quelli di classe emissiva fino a Euro 3 entro il 2025.

L'attuazione della misura conta ad oggi complessivamente 189 nuove immissioni programmate. Per quanto riguarda lo stato degli ordini, buona parte di essi risulta già perfezionata, mentre la restante quota è in via di definizione a causa di rallentamenti procedurali legati alla fase di transizione del settore. Tali dilazioni derivano principalmente dal clima di profonda ridefinizione che caratterizza il comparto del trasporto pubblico in Piemonte, attualmente attraversato da un'intensa fase di fermento istituzionale e operativo in vista dell'assegnazione dei servizi tramite gare pubbliche aperte. Malgrado queste complessità di natura amministrativa, risultano ad oggi integralmente rendicontabili 29 unità immatricolate e immesse in servizio.

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalle fonti di finanziamento finalizzate al rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso il FSC 2021-2027, la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 21-2058 del 22 dicembre 2025 "Legge regionale n. 1/2000. Approvazione, per il periodo 2025-2033, delle nuove disposizioni per la definizione e l'attuazione degli investimenti per il rinnovo del parco rotabile per il trasporto pubblico locale su gomma delle aziende titolari di contratto di servizio." che consente di riassegnare le risorse non utilizzate alle aziende che manifestino l'intenzione di cofinanziare maggiormente l'acquisto dei mezzi con risorse proprie e incrementarne il numero.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Strategie territoriali d'area omogenea

Costo totale: 115.500.000 - Importo FSC 2021-2027: 105.000.000

Con questa linea di intervento, la Regione ha avviato un percorso di programmazione integrata di sviluppo e riqualificazione territoriale. L'iniziativa si colloca in un disegno di più ampio respiro, promosso dalla Regione, volto a coinvolgere tutte le amministrazioni locali piemontesi in programmi di investimento e sviluppo finanziati, in parte, con risorse aggiuntive: Strategia Aree interne, Strategie Urbane d'Area e Strategie territoriali d'area omogenea (D.G.R. 6 febbraio 2023, n. 1-6477, Indirizzi per la programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del PR FESR 2021-2027, del FSC 2021-2027 e della programmazione di fondi regionali.

Attraverso le Strategie Territoriali d'area omogenea, una parte del territorio regionale è stata suddivisa in 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), composte da un numero variabile di comuni. Ciascuna ATO, coordinata da un soggetto capofila, elabora e attua un piano di interventi mirato a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. L'operazione coinvolge 805 amministrazioni comunali e più di 1 milione e 158mila cittadini. A seguito di una fase di condivisione con gli enti coinvolti, la Giunta regionale ha deliberato (D.G.R. n. 8152 del 12 febbraio 2024), la composizione definitiva delle 24 Aree Territoriali Omogenee nonché le modalità attuative della linea di intervento. Si sono concluse le procedure di approvazione dei programmi delle singole ATO, corredati dei relativi progetti di rilevanza comunale e sovra-locale.

Con la determinazione dirigenziale n. 157 del 31 maggio 2024 è stato attivato l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle "Strategie territoriali d'area omogenea" in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024.

A seguito dei lavori della commissione, sono stati valutati e selezionati i progetti ammissibili e tra fine novembre e dicembre 2024 sono state assunte le 24 determinazioni con l'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria.

Successivamente alla fase di ammissibilità, i soggetti proponenti hanno richiesto i codici CUP dei progetti e predisposto una scheda con ulteriori dettagli in merito ai progetti ammessi a finanziamento.

A seguito della verifica documentale, sono stati assunti tutti gli atti di concessione relativi alle 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), di seguito elencate:

- 1 Area Alta Val Tanaro e Cebano
- 2 Area Alto Monferrato
- 3 Area Appennino alessandrino
- 4 Area Bacino del Tanaro
- 5 Area Baraggia

- 6 Area Biellese
- 7 Area Borghi delle Vie d'Acqua
- 8 Area Canavese
- 9 Area Laghi
- 10 Area Monferrato Casalese Terre di Po
- 11 Area Monferrato Heritage UNESCO
- 12 Area Monregalese
- 13 Area Novarese
- 14 Area Orco e Soana
- 15 Area Ossola
- 16 Area Pianura cuneese
- 17 Area Pianura torinese
- 18 Area Roero
- 19 Area Terra di Langa
- 20 Area Terre del Monviso
- 21 Area Terre di Langa e Monferrato
- 22 Area Val di Susa
- 23 Area Valle Stura
- 24 Area Valli Chisone e Germanasca

Tra il 27 marzo 2025 e il 22 maggio 2025 sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte le 24 determinazioni dirigenziali di concessione dei contributi, per un totale di 100 milioni di euro concessi, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/aree-territoriali-omogenee-concessione-contributi-fsc-2021-2027>

Nel corso del 2025, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate delibere, si è avviata la fase di programmazione delle risorse premiali, pari a 5.000.000 euro, per quei piani di sviluppo in grado di attivare ricadute territoriali di area vasta: con la D.G.R. n14- 1108 del 12 maggio 2025 sono stati approvati i criteri per l'attribuzione delle risorse.

Sono state individuate tre fasce di merito, con relative risorse assegnate, in ragione dell'obiettivo di sollecitare dinamiche di programmazione d'area su tutto il territorio regionale:

- 300.000 euro: per le aree che nella valutazione hanno ottenuto un punteggio sopra i 75 punti
- 200.000 euro: tra i 50 e i 75 punti;
- 150.000 euro: sotto i 50 punti.

Con la D.D. 326 del 18/12/2025 sono stati ammessi 42 progetti al finanziamento con le risorse premiali attribuite sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R n. 14-1108 del 12 maggio 2025 per totale, comprensivo di cofinanziamento di 6.740.745 euro; 2 progetti ammessi al finanziamento con le risorse non programmate nella prima fase quantificate in 250.558,65 euro.

Nel contempo, la Regione, in collaborazione con l'IRES Piemonte e sulla base delle proposte presentate dal territorio, ha predisposto un dossier che riporta, per ogni ATO, i principali indicatori socio economici e le strategie emergenti dai progetti proposti dalle amministrazioni locali.

La Giunta regionale Piemonte ha approvato i 24 Accordi di Collaborazione, uno per ogni Area Territoriale Omogenea (ATO), che consentiranno la piena attuazione di questo specifico filone del Fondo di Sviluppo e Coesione. Sono stati finanziati in totale 841 progetti, di cui 53 con valenza sovra-comunale.

Dall'11 marzo al 13 maggio sono stati organizzati gli incontri territoriali per la sottoscrizione, da parte di tutti i Sindaci coinvolti, degli Accordi di Collaborazione, che formalizzano il recepimento e l'avvio delle strategie di sviluppo elaborate dalle Aree Territoriali Omogenee.

La linea di intervento risulta già in fase di attuazione, anche se in diversa misura tra le singole Aree Territoriali Omogenee (cfr. tabella). In base all'ultimo monitoraggio, si registra una spesa FSC superiore ai 17,5 milioni di euro (oltre il 16,5% delle risorse FSC assegnate).

SPESA SOSTENUTA DAI BENEFICIARI – DATI DI MONITORAGGIO AL 30/06/2026

TITOLO	IMPORTO CONTRIBUTO FSC 21-27	SPESA FSC 21-27 RAGGIUNTA	% di spesa raggiunta
01 Area Alta Valle Tanaro e Cebano	2.386.429,50	151.815,10	6,36%
02 Area Alto Monferrato	5.700.063,00	636.592,91	11,17%
03 Area Appennino alessandrino	3.105.245,20	279.506,35	9,00%
04 Bacino del Tanaro	4.765.728,39	713.344,10	14,97%
05 Area Baraggia	2.940.763,82	566.646,12	19,27%
06 Area Biellese	5.973.151,00	895.173,56	14,99%
07 Area Borghi delle Vie d'Acqua	7.136.100,00	1.319.226,62	18,49%
08 Area Canavese	8.887.004,45	2.202.620,01	24,78%
09 Area Laghi	6.206.759,55	635.418,00	10,24%
10 Area Monferrato Casalese e Terre di Po	7.723.313,58	1.031.258,03	13,35%
11 Area Monferrato Heritage UNESCO	4.547.400,00	727.810,13	16,00%
12 Area Monregalese	4.248.607,00	755.603,52	17,78%
13 Area Novarese	4.977.709,92	1.150.936,17	23,12%
14 Area Orco e Soana	4.099.002,68	656.787,13	16,02%
15 Area Ossola	2.867.580,30	290.382,55	10,13%
16 Area Pianura cuneese	3.698.202,00	688.321,01	18,61%
17 Area Pianura torinese	3.991.122,00	575.074,92	14,41%
18 Area Roero	2.822.654,00	587.886,00	20,83%
19 Area Terra di Langa	2.783.375,00	921.842,78	33,12%
20 Area Terre del Monviso	2.923.435,74	415.020,54	14,20%
21 Area Terre di Langa e Monferrato	5.272.738,00	787.279,56	14,93%
22 Area Val di Susa	2.650.744,54	1.054.736,21	39,79%
23 Area Valle Stura	2.919.743,10	386.409,33	13,23%
24 Area Valli Chisone e Germanasca	2.237.860,00	194.463,04	8,69%
	105.000.000,00	17.624.153,69	16,78%

Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate

Costo totale: 34.849.287,56 - Importo FSC 2021-2027: 31.749.287,56

Attraverso questa seconda linea di intervento, la Regione, in collaborazione con alcune amministrazioni locali, ha definito sei Accordi di programma composti da interventi mirati a soddisfare le esigenze di sviluppo delle comunità locali, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale e il rispetto dei principi della programmazione FSC 2021-2027.

Il percorso che ha portato all'attivazione della linea d'azione e alla sottoscrizione degli accordi di programma si è articolato nei seguenti passaggi.

Con D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 sono state approvate, per il triennio 2023-2025, le disposizioni relative all'Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale. A tale iniziativa è stata destinata una dotazione iniziale di 3.000.000 euro, suscettibile di successiva integrazione attraverso risorse provenienti da fondi regionali, fondi FSC del PSC Piemonte (Piano di Sviluppo e Coesione 2000/2020) e dalle assegnazioni della programmazione FSC 2021-2027.

Con D.D. n. 246 del 3 agosto 2023 è stata disposta l'attivazione dell'Avviso, definendo nel dettaglio tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle domande. Successivamente, con D.D. n. 360 del 30 ottobre 2023, a seguito delle valutazioni condotte da un'apposita commissione, sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse e non ammesse.

Con D.G.R. 67-7973 del 18 dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi di carattere generale sulla collocazione degli interventi di sviluppo locale da realizzare mediante lo strumento dell'accordo di programma, in attuazione della D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Coesione Piemonte, sono state integrate le risorse. A seguito della pubblicazione della delibera CIPESS n. 27 del 2024 di assegnazione delle risorse, si sono perfezionati gli atti per l'avvio dei progetti, come di seguito specificato:

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 14-490

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area Lanzo e Canavese** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Foglizzo, Lanzo Torinese, Locana, Nole, Rivarolo Canavese e Viù. Risorse pari ad euro 4.570.500,00;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 15-491

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante nord est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della

Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Massino Visconti, Palazzolo Vercellese, Rimella, Ronsecco, Rosazza e Varallo. Risorse pari ad euro 3.196.593,96;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 16-492

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante sud est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Castellero, Castelnuovo Scrivia, Monleale e l’unione Montana Valli Borbera e Spinti. Risorse pari ad euro 2.457.931,80;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 17-493

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area sud ovest metropolitano** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bibiana, Carmagnola, Orbassano, Poirino, Rivalta di Torino, Sangano e Villar Perosa. Risorse pari ad euro 3.336.254,78;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 18-494

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Territorio delle valli cuneesi** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo. Risorse pari ad euro 5.114.417,66;

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2025, n. 8-1050

FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023. CIPESS n. 27/2024. Linea d'intervento "Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di programma". Disposizioni, per un importo pari ad euro 1.200.000,00, per lo scorrimento della graduatoria approvata, in attuazione alla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023.

Infine, pur trattandosi di provvedimenti approvati al di fuori del periodo di riferimento del monitoraggio (gennaio-giugno 2026), si informa che:

- a seguito della quarta proposta di modifica dell’Accordo, sottoposta al COTIV e approvata con nota DPCOE prot. n. 0012071-P del 12 giugno 2026 è stata variata la denominazione della linea d’azione. Tale modifica ha permesso di avviare una nuova procedura di selezione di proposte progettuali;
- con deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. 23-2833 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027., linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023, sono state approvate le disposizioni per l'avviso da attivare, anni 2026-2028, per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale;

- con D.D. 14 luglio 2026, n. 116 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, linea d'azione "Finanziamento degli Accordi di Programma da attuarsi tramite avvisi, bandi e procedure negoziate", di cui all'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023, è stato approvato, in attuazione della D.G.R. n. 23-2833 del 13 luglio 2026 dell'avviso pubblico per gli anni 2026-2028 per la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale e l'apertura dei termini di presentazione delle proposte .

Al monitoraggio del 30/06/2026 la linea registra impegni FSC per 16,8 milioni di euro e pagamenti FSC per circa 6 milioni di euro.

Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

Costo totale: 60.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 60.000.000

Questa linea di intervento sostiene progetti di investimento per stazioni sciistiche al fine di potenziare l'attrattività turistica del territorio montano. Suddivisi per ambiti territoriali che comprendono la Provincia di Cuneo, la Città Metropolitana di Torino e le altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania e Alessandria), gli interventi finanziabili riguardano la sostituzione, la realizzazione e il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, includendo attrezzature, opere accessorie e bacini idrici.

Le procedure per la selezione dei progetti da finanziare sono state avviate con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 18 ottobre 2024, n. 6 - 272 e del 21 novembre 2024, n. 9 - 397.

Con D.G.R. n. 6 - 272 del 18 ottobre 2024, la Giunta regionale ha approvato, in ottemperanza all'articolo 6, comma 5, del sopra citato Accordo per la coesione ed ai sensi della legge regionale n.2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando" (cod. ID FSCRI_RI_147), stabilendo una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50.000.000,00.

Con D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, nell'ambito del suddetto «Accordo per la Coesione», la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere gli interventi in parola, con una spesa regionale complessiva massima pari ad euro 50.375.000,00.

Con D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025 la Giunta regionale ha approvato le modifiche dell'allegato A alla D.G.R. n. 9 - 397 del 21 novembre 2024, recependole in un testo coordinato riportato nell'allegato Abis e demandando alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

In attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica con D.D. n. 532 del 27/12/2024, ha provveduto:

- ad approvare l'offerta di servizio e lo schema di contratto da stipulare con Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione dei servizi connessi all'indizione, gestione e controllo del bando di assegnazione dei contributi in argomento, a fronte delle risorse già stanziare con D.G.R. 6 - 272 del 18 ottobre 2024;
- ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. l'importo di euro 50.000.000,00, a titolo di trasferimento per la copertura dell'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando", secondo la seguente ripartizione:
 - o euro 6.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2025;
 - o euro 44.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2026.

L'ufficio ha quindi formalizzato il contratto di servizio con Finpiemonte SpA per la gestione del bando in argomento per un totale di euro 310.349,44 (IVA inclusa); il contratto è stato sottoscritto il 29/4/2025 ed è stato repertoriato con numero 274/2025.

Con D.D. n. 137 del 13/05/2025, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ha provveduto:

- all'approvazione del "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030";
- all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, stabilendo che le istanze dovevano essere presentate esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo "FINanziamenti DOMande", entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento.

Con D.D. 277 del 30.7.2025 sono stati nominati i due funzionari regionali quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze di contributo a valere sul "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030" di cui alla D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025.

La commissione di valutazione delle istanze si è riunita il 31 luglio 2025 presso Finpiemonte S.p.A. per la prima seduta di insediamento, nella quale si è stabilito che la stessa è composta da 3 membri, di cui un funzionario indicato da Finpiemonte S.p.A. e due funzionari indicati dalla Regione Piemonte.

La commissione di valutazione, preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo risultavano pervenute 50 proposte progettuali, ha stabilito di istruire le domande pervenute valutando gli ambiti territoriali nel seguente ordine: TORINO, ALTRE Province piemontesi (VC, BI, VB, AL), CUNEO, esaminando in prima battuta tutte le domande relative allo sci di discesa e, a seguire, quelle relative allo sci di fondo.

Conclusa la valutazione delle domande di contributo relative allo sci di discesa e allo sci di fondo, la commissione ha stilato le apposite graduatorie e il Settore regionale competente ha formalizzato l'assegnazione dei contributi attraverso 4 successive determinazioni dirigenziali:

- con D.D. 535 del 20.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale TORINO;
- con D.D. 536 del 20.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale ALTRE Province piemontesi (VC, BI, VB, AL);

- con D.D. 541 del 21.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale CUNEO;
- con D.D. 544 del 21.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di FONDO.

Con D.D. 763 del 31.12.2025, si sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese relative ai progetti beneficiari dei contributi regionali a valere sul “Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 - 2030”, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 9 - 397 del 21 novembre 2024 e dalla D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025; in particolare, si è precisato che i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute unitamente a tutta la documentazione richiesta nelle tempistiche previste dal bando (entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 30/06/2030).

Sono stati ricordati i termini di esecuzione delle opere, ossia che i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla stipula del contratto con l'appaltatore o dalla stipula del contratto PPP, con eventuali proroghe fino a 12 mesi a fronte di motivata richiesta (termine ultimo 21/02/2030).

È stato inoltre specificato che le rendicontazioni dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo della Piattaforma Bandi alla quale si può accedere all'indirizzo web: <http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/bandi>, chiarendo che l'utilizzo di tale piattaforma è finalizzato alla rilevazione delle spese e alla successiva formalizzazione della dichiarazione di spesa.

In data giovedì 7 maggio 2026 si è svolto un webinar dedicato a tutti i beneficiari di contributo, occasione per chiarire ancora una volta le procedure amministrative e verificare i termini delle scadenze previste dal bando; sono state riepilogate le linee guida per la rendicontazione dei contributi ed è stata ricordata la necessità di alimentare costantemente il monitoraggio delle schede di avanzamento spesa inviate da Finpiemonte; sono state infine fornite indicazioni utili per il caricamento della documentazione sul gestionale.

In data 14.4.2026 è stato processato l'atto di liquidazione n. 3156 per un importo di euro 6.000.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.a., a titolo di primo acconto per la dotazione del Fondo 1077 - Bando investimenti Sistema neve Regione Piemonte 2025-2030 - Contratto rep. 274/2025.

Nel frattempo si segnala che al 4.6.2026 (entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie) i soggetti individuati come beneficiari dovevano presentare via PEC a Finpiemonte S.p.a., la documentazione prevista al punto 9.2 del “Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030”.

Entro lo stesso termine gli uffici di Finpiemonte, in accordo con il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, hanno ottenuto dai beneficiari di contributo i relativi riscontri circa le eventuali procedure di Valutazione ambientale, in particolare in relazione a:

- Valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006)
- Valutazione preliminare (art. 6 comma 9bis del d.lgs. 152/2006)

- Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del d.lgs. 152/2006)
- Valutazione di impatto ambientale (art. 27 bis del d.lgs. 152/2006)

Su questo argomento, che potrebbe richiedere un iter amministrativo particolarmente gravoso, si è istituito un tavolo di lavoro per un confronto interno che anticipi l'istruttoria e il processo autorizzativo, così da comprendere fin da subito le necessità dei comuni coinvolti rispetto ai progetti presentati. Questo gruppo di lavoro, oltre al Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, vede la partecipazione di colleghi dei settori Geologico, Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, Tecnico Piemonte Nord e Tecnico Piemonte Sud.

Si segnala infine che, a seguito dell'accoglimento della terza proposta di modifica dell'Accordo, che approvava la variazione della denominazione della presente linea d'azione - necessaria per ottimizzare le opzioni di scelta dei progetti da attivare, rendendo più efficace la selezione dei progetti strategici, di rilevanza regionale e nazionale - è stato possibile procedere alla definizione di nuovi interventi da finanziare, in particolare:

- è stata formalizzata, con Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2026, n. 18-2546 la destinazione di 4.200.000,00 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027 per un intervento di riqualificazione della stazione sciistica di Macugnaga;
- è stata formalizzata la destinazione di 300.000,00 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027 per un progetto di manutenzione straordinaria e ripristino della rete sentieristica tramite un accordo con il Club Alpino Italiano (CAI);
- è in fase di perfezionamento la concessione del contributo a favore di un intervento per la riapertura, dopo il tragico incidente del 23 maggio 2021, della funivia del Stresa-Mottarone, con il coinvolgimento del Ministero del Turismo.

ENERGIA – SOCIALE E SALUTE

Linee di intervento e quadro programmatico

Nell'ambito della programmazione FSC 2021–2027, sono state attivate tre linee di azione rivolte alle strutture sanitarie regionali:

- Riqualificazione energetica – costo totale euro 23.812.365 (FSC 2021–2027: euro 23.812.365);
- Ammodernamento del parco tecnologico – costo totale euro 47.696.321 (FSC 2021–2027: euro 47.696.321);
- Potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale e ospedaliera – costo totale euro 140.491.314 (FSC 2021–2027: euro 140.491.314).

Le suddette linee sono state avviate con D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024, in attuazione del Decreto-legge 124/2023 e della Delibera CIPESS 25/2023, recante indirizzi per l'avvio delle azioni afferenti agli ambiti “Sociale e salute” ed “Energia”, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 7 dicembre 2023 tra il Governo e la Regione Piemonte. Il provvedimento ha approvato gli indirizzi per l'individuazione e l'attuazione degli interventi, per un macro progetto di rilancio della sanità pubblica di importo complessivo pari a euro 212.000.000.

Con D.D. n. 547 del 07/08/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione, da parte degli Enti del SSR, delle proposte di intervento, disciplinando l'istruttoria regionale articolata nelle seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità e ammissibilità del soggetto proponente e dell'intervento;
- valutazione tecnico-finanziaria e di merito, comprensiva dell'eventuale attribuzione di premialità.

Attuazione nel 2024 e primo semestre 2025

Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) hanno fornito indicazioni in merito ai progetti di investimento. Nel primo semestre 2025 si è provveduto ad ammettere a finanziamento la prima quota di interventi a valere sulle risorse FSC 2021–2027 (in attuazione della citata D.D. 547/2024)

Con D.D. n. 98 del 25/02/2025 - avente ad oggetto “D.D. 547 del 07/08/2024. Ammissione degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto Rilancio della sanità pubblica (..)” - sono stati ammessi a finanziamento i primi interventi delle ASR piemontesi per un importo complessivo pari a euro 102.394.371,96, ripartito tra le tre macro-linee previste.

Con D.D. n. 176 del 30/03/2025 è stato inoltre recepito il Si.Ge.Co., comprensivo dei relativi allegati. La succitata D.D. è stata successivamente trasmessa alle A.S.R. piemontesi con nota regionale prot. 8216 del 01/04/2025.

Nel corso del 2025, con appositi provvedimenti, si è inoltre proceduto ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e a finanziare ulteriori progetti urgenti. In particolare, gli atti amministrativi di rimodulazione-integrazione sono stati i seguenti:

- D.D. n. 247 del 24/04/2025: ammissione di quattro nuovi interventi per l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (con la già citata D.D. n. 98 del 25/02/2025);
- D.D. n. 253 del 28/04/2025: rettifica di un CUP relativo a intervento dell'ASL Cuneo 1.

Attuazione secondo semestre 2025

Nel secondo semestre 2025 la Direzione Sanità ha proseguito l'attuazione del programma. Sono stati ammessi a finanziamento nuovi interventi per un importo totale pari a euro 45.202.840,46, destinati al rafforzamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e delle dotazioni del sistema sanitario regionale, nonché al miglioramento dei livelli di sicurezza, efficienza e qualità dei servizi erogati. Le relative ammissioni a finanziamento sono state formalizzate mediante i seguenti provvedimenti:

1. D.D. n. 384/A1400B del 11/07/2025 – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: euro 250.000,00;
2. D.D. n. 385/A1400B del 11/07/2025 – ASL di Asti: euro 1.600.000,00;
3. D.D. n. 459/A1400B del 31/07/2025 – ASL di Biella, ASL Cuneo 2, ASL Città di Torino per un totale di euro 3.465.200,00;
4. D.D. n. 879/A1400B del 23/12/2025 – diverse ASR per un totale di euro 35.856.040,46;
5. D.D. n. 905/A1400B del 29/12/2025 – nuovi interventi dell'AO Ordine Mauriziano per euro 4.031.600,00.

Alla data attuale, le risorse complessivamente ammesse a finanziamento sulle tre linee FSC ammontavano a euro 143.565.612,42. In particolare:

- la linea relativa al potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale assorbe la quota più rilevante delle risorse, con interventi ammessi per un totale di euro 85.591.066,09, confermando il ruolo strategico attribuito al rafforzamento dell'assistenza territoriale e all'integrazione con la rete ospedaliera
- la linea di ammodernamento del parco tecnologico, per la quale risultano ammessi a finanziamento interventi per complessivi euro 43.579.035,37, finalizzati al rinnovo e all'aggiornamento delle dotazioni sanitarie e tecnologiche delle strutture del Servizio Sanitario Regionale
- la linea dedicata alla riqualificazione energetica evidenzia un ammontare ammesso pari a euro 14.395.510,96, a sostegno di interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi delle infrastrutture sanitarie.

Attuazione primo semestre 2026

Nel corso del primo semestre 2026 la Direzione Sanità ha proseguito l'attuazione del programma FSC 2021–2027, consolidando il percorso di finanziamento degli interventi avviato nel 2025. In particolare, mediante la D.D. n. 64/A1400B dell'11/02/2026 e la successiva D.D. n. 109/A1400B del 02/03/2026, sono stati ammessi a finanziamento nuovi interventi per un importo complessivo pari a euro 26.408.841,85.

Le risorse sono state destinate prevalentemente alla linea di potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale e ospedaliera, cui sono stati assegnati euro 24.793.681,85, confermando la priorità attribuita al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie regionali. Ulteriori euro 1.455.160,00 sono stati destinati alla linea di ammodernamento del parco tecnologico e degli arredi, mentre euro 160.000,00 hanno riguardato interventi di

riqualificazione energetica, contribuendo al perseguimento degli obiettivi di efficientamento e sostenibilità del patrimonio sanitario regionale.

Al 30 giugno 2026, le risorse complessivamente ammesse a finanziamento sulle tre linee di intervento ammontano a euro 169.974.454,27. In particolare:

- la linea relativa al potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale e ospedaliera assorbe la quota più rilevante delle risorse, con interventi ammessi a finanziamento per complessivi euro 110.384.747,94, registra un incremento del 29% rispetto al secondo semestre 2025;
- la linea di ammodernamento del parco tecnologico e degli arredi evidenzia interventi ammessi per euro 45.034.195,37, con un incremento del 3% rispetto al periodo precedente;
- la linea dedicata alla riqualificazione energetica raggiunge un ammontare complessivo di euro 14.555.510,96, in crescita dell'1% rispetto al secondo semestre 2025;

Nel secondo semestre 2026 l'attuazione del programma proseguirà mediante ulteriori attività di ricognizione dei fabbisogni delle ASR, finalizzate all'individuazione di nuovi interventi coerenti con gli obiettivi dell'Accordo per la Coesione e alla prosecuzione del percorso di impiego delle risorse FSC 2021–2027.

In merito al monitoraggio, il settore A1416D (controllo di gestione e sistemi informativi della Direzione Sanità) nel corso del primo semestre 2026 ha proseguito le attività di controllo degli interventi ammessi a finanziamento. Nelle more della messa in esercizio del sistema informativo ministeriale dedicato, è stata sviluppata e resa operativa una piattaforma gestionale regionale, evoluzione del precedente ambiente *cloud* utilizzato nella fase iniziale esclusivamente per il caricamento della documentazione. Il nuovo strumento consente una gestione più strutturata e dinamica delle informazioni, favorendo il monitoraggio procedurale, amministrativo e finanziario degli interventi e una più efficace interlocuzione con le ASR.

Contestualmente sono stati avviati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, i primi controlli documentali sugli interventi ammessi a finanziamento, finalizzati alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa, presupposto necessario per l'avvio delle procedure di erogazione delle risorse assegnate.

CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Assistenza Tecnica FSC 2021-2027 – Costo totale e Importo FSC 2021-2027: 3.980.847,72

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 3 comma 3, che nell'ambito delle risorse assegnate, l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 3.980.847,72 a valere sulla dotazione ordinaria - inferiore alla misura massima del 4 per cento del FSC 2021-2027 al lordo delle anticipazioni ma al netto del cofinanziamento dei Programmi Regionali europei – sia destinato all'assistenza tecnica a supporto della gestione e attuazione dell'Accordo. La linea di azione è finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni dell'Accordo.

La D.G.R. n. 24-207 del 27 settembre 2024, prendendo atto di quanto definito dalla Delibera CIPESS 27/2024, ha individuato il settore Programmazione Negoziata quale Responsabile dell'attuazione della linea di azione nonché Autorità di Gestione dell'Accordo, e il settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli quale Responsabile dei Controlli.

Con D.G.R. n. 30-212 del 27 settembre 2024 “Iscrizione di fondi statali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, ai sensi della Deliberazione CIPESS n. 27/2024” sono state stanziare le risorse sul bilancio regionale afferenti a tale linea di azione pari a euro 3.980.847,72.

Nel mese di ottobre 2024 è stato acquisito il CUP J69B24000240001 e sono state avviate le attività per definire soluzioni e fabbisogni organizzativi relativi alla gestione, valutazione e monitoraggio degli interventi e delle linee di azione dell'Accordo.

Al 31.12.2024 è stato sottoscritto il primo contratto con Finpiemonte per la gestione del bando di erogazione contributi agli enti locali piemontesi per sport montani e sono impegnate risorse per un totale di euro 310.349,44.

Al 31.12. 2025 sono state avviate ulteriori procedure per i seguenti affidamenti:

- servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione dell'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte FSC 2021-2027;
- stipula contratto con IRES Piemonte per l'attività di collaborazione alla redazione delle relazioni semestrali di attuazione, nonché per lo svolgimento di analisi e approfondimenti tematici e settoriali a supporto dell'attuazione dell'Accordo 2021-2027;
- avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi tecnico-professionali di comunicazione pluriennale integrata per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 21-27, per il triennio 2025 - 2027.

La Regione Piemonte ha richiesto l'utilizzo del sistema di monitoraggio che sarà messo a disposizione del Dipartimento per le politiche di coesione.

Al 30.06.2026 è stato affidato il servizio di supporto informatico per le funzioni gestionali e di rendicontazione degli interventi dell'Accordo di Coesione e sono state avviate le procedure di affidamento del servizio di controllo documentale e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico-tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Accordo di Coesione 2021-2027.

2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021

La tabella sottostante offre una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento finanziario degli interventi promossi con le Anticipazioni FSC. Sotto il profilo procedurale, si segnala che **tutti gli interventi hanno rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle OGV** al 31 dicembre 2024. Nel corso del 2025 i trasferimenti a valere sulle risorse Anticipazione FSC ammontano a 44.289.691,15 euro. Nel corso del primo semestre 2026 non sono state formalizzate richieste di trasferimento risorse. Per quanto riguarda il profilo finanziario, si rileva nel complesso un buon livello di avanzamento. Gli impegni ammontano a 122,8 milioni di euro, pari a quasi l'importo assegnato (98%) mentre i pagamenti ammontano a circa 78,6 milioni (il 62,7% dell'assegnato), evidenziando un avanzamento significativo anche per la fase realizzativa.


Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: stato di attuazione finanziaria (30/06/2026)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui:	IMPEGNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	NUMERO INTERVENTI
		FSC 21-27	FSC 21-27	%	FSC 21-27	%	
		a	b	c=b/a	d	e=d/a	f
02-DIGITALIZZAZIONE	13.000.000,00	13.000.000,00	12.202.327,02	93,9%	9.940.043,57	76,5%	2
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000,00	13.000.000,00	12.202.327,02	93,9%	9.940.043,57	76,5%	2
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	24.157.466,00	23.500.000,00	22.512.776,54	95,8%	20.374.396,80	86,7%	7
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	24.157.466,00	23.500.000,00	22.512.776,54	95,8%	20.374.396,80	86,7%	7
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2.522.453,41	1.837.822,91	1.819.636,06	99,0%	1.814.186,74	98,7%	13
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500,00	199.500,00	181.314,77	90,9%	181.314,77	90,9%	3
05.04-BONIFICHE	2.322.953,41	1.638.322,91	1.638.321,29	100,0%	1.632.871,97	99,7%	10
06-CULTURA	10.500.000,00	10.500.000,00	10.066.932,67	95,9%	3.026.746,11	28,8%	2
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0%	255.212,28	5,1%	1
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,1%	2.771.533,83	50,4%	1
07-TRASPORTI E MOBILITA'	6.000.000,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,5%	528.464,23	33,2%	1
07.01-TRASPORTO STRADALE	6.000.000,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,5%	528.464,23	33,2%	1
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	74.887.321,06	99,9%	42.963.622,51	57,3%	57
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	74.887.321,06	99,9%	42.963.622,51	57,3%	57
TOTALE COMPLESSIVO	131.150.943,41	125.353.922,91	122.848.733,51	98,0%	78.647.459,96	62,7%	82

L'analisi per area tematica evidenzia, a fronte di un livello di impegno delle risorse ormai prossimo alla saturazione in quasi tutte le aree – fatta eccezione per l'area Trasporti e Mobilità, che si attesta comunque su una quota di impegnato pari all'85,5 per cento – un andamento dei pagamenti più differenziato. Sotto quest'ultimo profilo è l'area Ambiente e Risorse Naturali (99,7 per cento) quella con il più elevato grado di avanzamento, seguita da Competitività Imprese (pagamenti all'86,8 per cento) e Digitalizzazione (76,5 per cento). Un livello intermedio si riscontra per Istruzione e Formazione (57,3 per cento), mentre le quote di pagamenti relativamente più contenute si registrano in Trasporti e Mobilità (33,2 per cento) e, soprattutto, Cultura, che pur presentando un tasso di impegno elevato (95,9 per cento) registra una quota di pagamenti al 28,8 per cento.

Il grafico sottostante illustra l'andamento finanziario degli interventi sostenuti attraverso le anticipazioni su base annuale e semestrale. In un contesto in cui la fase di impegno delle risorse può ormai considerarsi pressoché conclusa, con il 98% delle disponibilità del FSC già allocate,

gli impegni sono sostanzialmente allineati al valore registrato nel giugno 2025 (122,8 milioni). Sul versante dei pagamenti si rileva uno sviluppo positivo, con un incremento di circa il 20% su base annuale, si è infatti passati dai 63,5 milioni del dicembre 2024 agli attuali 77 milioni, distribuiti in modo sostanzialmente equilibrato nei due semestri.

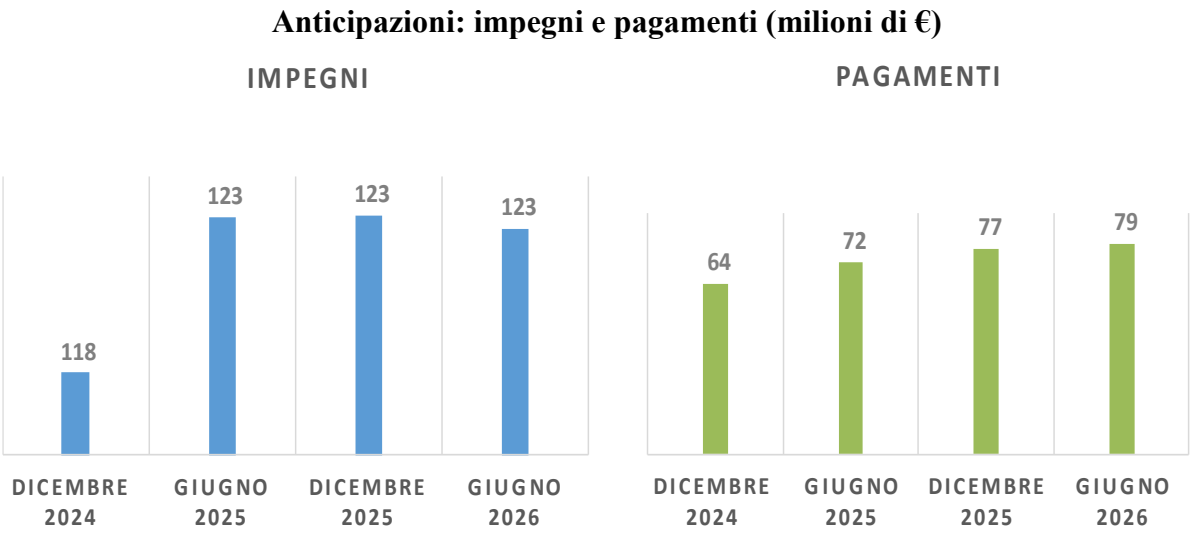

Per quanto concerne, infine, lo stato di avanzamento procedurale, si rileva il completamento di 37 interventi — pari al 45 per cento di quelli previsti — cui corrisponde un valore di risorse FSC pari a 37,3 milioni di euro, il 29,7 per cento delle risorse FSC assegnate in quota anticipazione. Gli interventi conclusi si concentrano nei settori *Bonifiche* ed *Educazione e formazione*.

Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: interventi conclusi (30/06/2026)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui:	INTERVENTI (n°)	di cui conclusi	
		FSC 21-27		(n°)	valore FSC
02-DIGITALIZZAZIONE	13.000.000,00	13.000.000,00	2		
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000,00	13.000.000,00	2		
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	24.157.466,00	23.500.000,00	7		
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	24.157.466,00	23.500.000,00	7		
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	2.522.453,41	1.837.822,91	13	7	1.341.407,08
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500,00	199.500,00	3		
05.04-BONIFICHE	2.322.953,41	1.638.322,29	10	7	1.341.407,08
06-CULTURA	10.500.000,00	10.500.000,00	2		
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000,00	5.000.000,00	1		
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000,00	5.500.000,00	1		
07-TRASPORTI E MOBILITA'	6.000.000,00	1.590.969,00	1		
07.01-TRASPORTO STRADALE	6.000.000,00	1.590.969,00	1		
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	57	30	36.000.735,06
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	57	30	36.000.735,06
TOTALE COMPLESSIVO	131.150.943,41	125.353.922,91	82	37	37.342.142,14

La tabella sottostante riporta l'elenco dei progetti per i quali si registrano economie. Il valore complessivo ammonta a 89.233,79 euro e derivano da progetti conclusi o da progetti in fase di rendicontazione finale.

CUP	TITOLO	Economie FSC
0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	33.237,00
J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	388,51
E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	9.000,78
J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO E GIFFLENGA	8.795,94
0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	37.807,94
0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP	2,00
E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	1,62
TOTALE		89.233,79

Infine, si riporta di seguito la tabella aggiornata con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle diverse linee di azione attivate (del 79_21_dettagli).

Accordo per la Coesione Regione Piemonte - Allegato alla relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del DL 124/2023
Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi (30 giugno 2026)

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
					a	b	c=b/a	d	e=d/a
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00	5.500.000,00	4.986.277,60	90,66%	3.647.375,37	66,32%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00	7.500.000,00	7.216.049,42	96,21%	6.292.668,20	83,90%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed ent ipubblici che gestiscono impianti sciistici	1.657.466,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00	6.000.000,00	5.852.289,39	97,54%	5.246.614,63	87,44%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00	11.966.763,00	11.966.763,00	100,00%	11.895.942,00	99,41%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00	4.500.000,00	3.693.724,15	82,08%	2.731.840,17	60,71%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00	46.504,06	46.504,06	100,00%	46.504,06	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00	24.811,49	24.811,49	100,00%	24.811,49	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00	109.999,22	109.999,22	100,00%	109.999,22	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79	192.748,79	192.748,79	100,00%	192.748,79	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	27.276,34	21.058,96	21.058,96	100,00%	21.058,96	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	770.000,00	316.838,95	316.838,95	100,00%	316.838,95	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	85.932,35	67.628,93	67.628,93	100,00%	67.628,93	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo e frazione San Bovo	111.058,17	45.343,00	45.343,00	100,00%	45.343,00	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50	13.422,50	13.422,50	100,00%	7.973,18	59,40%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	844.560,00	844.558,38	844.558,38	100,00%	844.558,38	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	29.349,26	19.072,90	19.072,90	100,00%	19.072,90	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	50.606,00	34.702,26	34.702,26	100,00%	34.702,26	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	B35I18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	198.000,00	82.946,62	82.946,62	100,00%	82.946,62	100,00%
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00	5.000.000,00	4.663.365,47	93,27%	255.212,28	5,10%
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,13%	2.771.533,83	50,39%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	6.000.000,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,47%	528.464,23	33,22%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00	38.932.479,00	38.932.479,00	100,00%	7.008.780,45	18,00%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP	36.038.543,00	35.954.842,06	35.954.842,06	100,00%	35.954.842,06	100,00%
TOTALE COMPLESSIVO				131.150.943,41	125.264.689,12	122.512.098,98	97,8%	78.647.459,96	62,8%

Piano di comunicazione e buone prassi

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 8 che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo stesso siano pubblicizzate sulla base di un Piano di comunicazione predisposto dalla Regione.

Il Piano di comunicazione è pubblicato nella sezione FSC del sito regionale alla pagina Programmazione FSC 2021-2027 - Piano di comunicazione 2025-2027 (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/piano-comunicazione-triennale-2025-2027>).

Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, con DGR n. n. 24-207 del 27 settembre 2024 la Giunta regionale ha nominato quale referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

Le attività di informazione e pubblicizzazione dell'Accordo incidono in particolar modo sulla trasparenza, sulla diffusione dei risultati e sulla valorizzazione dei progetti più significativi, con particolare riferimento alle azioni ritenute strategiche per la realizzazione complessiva dell'Accordo. Le comunicazioni rivolte ai beneficiari/soggetti attuatori, ai potenziali beneficiari/soggetti attuatori e, in generale, al pubblico anche da parte dei beneficiari/soggetti attuatori, devono contenere i seguenti loghi:



Gli interventi dell'Accordo, monitorati sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto. Le relazioni semestrali, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per l'Accordo, sono rese disponibili sul sito web della Regione Piemonte, nell'apposita sezione Regione Piemonte FSC 2021-2027.

Per dare attuazione al Piano, con D.D. n. 192/A2102C/2025 del 31 luglio 2025 è stato affidato, a seguito di RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di comunicazione pluriennale integrata per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, annualità 2025- 2026 -2027, per un importo complessivo di euro 248.520,00 con l'obiettivo di definire l'immagine coordinata della comunicazione regionale, in coerenza con le linee guida nazionali, e di diffondere la conoscenza delle opportunità, dei primi risultati e dell'impatto che l'FSC ha nello sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del Piemonte, ponendo attenzione,

nella comunicazione, anche all'integrazione strategica con altri Fondi, europei, nazionali e regionali.

L'attività operativa è stata avviata, con la progettazione creativa dell'identità grafica della comunicazione del Fondo e con la declinazione specifica per l'ambito delle Aree Territoriali Omogenee (ATO), con la realizzazione delle specifiche linee guida, da condividere con i beneficiari e gli attuatori. Sono stati realizzati due folder informativi e tutti i template grafici.

Per quanto riguarda le ATO, sono stati realizzati un logo di ambito e 24 sue declinazioni, ciascuno afferente alle singole Aree Omogenee.

È stato realizzato un tool kit per gli operatori ed è stato programmato un road show in 9 tappe, in cui sono stati incontrati oltre l'80% dei sindaci, in cui sono stati sottoscritti gli accordi territoriali, area per area. Per ogni tappa è stato realizzato un allestimento "comunicativo" e un dossier tematico di approfondimento su ciascuna ATO e sui progetti approvati e in corso di realizzazione. Per ogni tappa è disponibile un video, nell'apposita playlist su Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Tsgcfa04jZaiIPkU36Z2uu4qlAh4LFD) e una gallery fotografica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/comunicazione-fsc/sottoscrizione-accordi-aree-territoriali-omogenee-fsc>), mentre i dossier sono disponibili nell'apposita area del sito (<https://www.regione.piemonte.it/web/comunicazione/aree-territoriali-omogenee>).


Lo sviluppo del piano prevede la valorizzazione dei progetti, man mano che si concluderanno, attraverso delle schede progetto, delle video schede e un podcast. Al 30 giugno 2026 sono state realizzate 5 video schede, una video-scheda e la demo del podcast "il Piemonte che vorrei".

I materiali sono diffusi attraverso il sito regionale e i principali canali social istituzionali, oltre che attraverso la rete degli 805 Comuni coinvolti.

Nell'ambito dell'Accordo per la Coesione, linea di intervento "Bonifiche", è stato promosso un intervento per la realizzazione di Opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Corio e di opere idrauliche in Torrente Fandaglia (Assegnazione in anticipazione), che viene qui brevemente illustrato come **progetto esemplare** e buona prassi.

L'intervento si colloca nel sito dell'ex Amiantifera di Balangero e Corio, un'imponente area di oltre trecento ettari situata nella provincia di Torino – a poche decine di chilometri a nord-ovest del capoluogo – che occupa lo spartiacque tra i due comuni e che, per gran parte del Novecento, ha ospitato la più grande miniera di amianto d'Europa. Durante gli anni di attività, e in particolare nel corso degli anni Settanta, l'Amiantifera si è affermata come uno degli impianti più moderni e avanzati del settore a livello internazionale, rappresentando al contempo una fondamentale risorsa economica e occupazionale per l'economia locale. La svolta arriva all'inizio degli anni Novanta con il fallimento della società estrattiva e la conseguente cessazione della produzione, seguita dall'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257. Tale normativa ha vietato su tutto il territorio nazionale l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e l'utilizzo dell'amianto, sancendone la pericolosità per la salute pubblica. L'articolo 11 della medesima legge, espressamente dedicata alla miniera di Balangero, ha avviato un articolato percorso di risanamento. L'intervento si è rivelato sin da subito di notevole complessità: la contaminazione da amianto (nella forma di crisotilo) non interessa infatti soltanto il corpo roccioso e le discariche, ma investe anche le strutture produttive dismesse, le lastre di copertura, i macchinari e i fanghi dei bacini di decantazione. Per l'estensione dell'area

e la diffusione capillare dell'inquinante, il complesso è stato riconosciuto Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (S.I.N.) ai sensi della legge n. 426/1998.

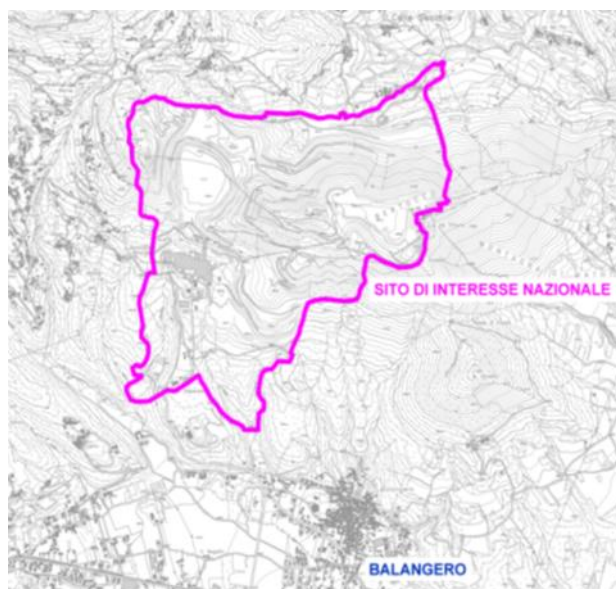


Il perimetro del sito di interesse nazionale

Il percorso di recupero dell'ex miniera si è sviluppato per fasi successive, avvalendosi di R.S.A. S.r.l., una società a capitale interamente pubblico costituita nel 1994 per attuare gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e valorizzazione dell'area. Una prima fase, conclusasi nei primi anni Duemila, si è concentrata sulla messa in sicurezza d'emergenza, con l'obiettivo prioritario di contenere il rischio idrogeologico legato al movimento delle discariche e di proteggere i corsi d'acqua, affiancata dall'avvio di un monitoraggio costante delle fibre di amianto disperse nell'aria. A partire dall'Accordo di Programma del 2007, l'intervento assume un respiro più ampio, orientandosi verso la riqualificazione complessiva del territorio: vengono realizzate importanti opere di regimazione idraulica e di stabilizzazione dei versanti, tra cui la riprofilatura a gradoni del grande accumulo di detriti verso Corio, pensata per favorire il ritorno della vegetazione boschiva e arbustiva. Per consentire alla popolazione locale e più in generale ai cittadini di osservare l'evoluzione delle attività di bonifica e di rigenerazione territoriale, vengono periodicamente organizzate iniziative pubbliche, come le giornate "Porte Aperte".

È in questo contesto che si inserisce la realizzazione delle “Opere di messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato Corio e di opere idrauliche in Torrente Fandaglia”, un intervento del valore complessivo di 2.704.560 €, di cui 844.560 a valere sul FSC nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Il percorso progettuale, avviato nel 2015, ha registrato negli anni successive integrazioni, resi necessari anche dall'emergere di nuove criticità geomorfologiche. Il progetto, oggi sostanzialmente concluso, persegue due finalità principali, tra loro complementari: la salvaguardia sanitaria, attraverso il controllo e la riduzione del rischio di dispersione delle fibre di amianto, e la salvaguardia idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei versanti e una migliore gestione delle acque superficiali. Le fibre di amianto possono infatti diffondersi in tre modi principali – trasportate dal vento, trascinate dalle acque superficiali, oppure veicolate dal passaggio di persone e mezzi. Il progetto è stato concepito per ridurre, per quanto possibile, tutte e tre queste vie di diffusione, agendo sia sugli aspetti geologici e idraulici del sito sia sulla componente vegetale delle

superfici. A questi obiettivi si affianca una finalità di più ampio respiro, quella di restituire progressivamente all'area caratteristiche compatibili con un futuro utilizzo di tipo naturalistico, attraverso il recupero ambientale e paesaggistico delle zone interessate.

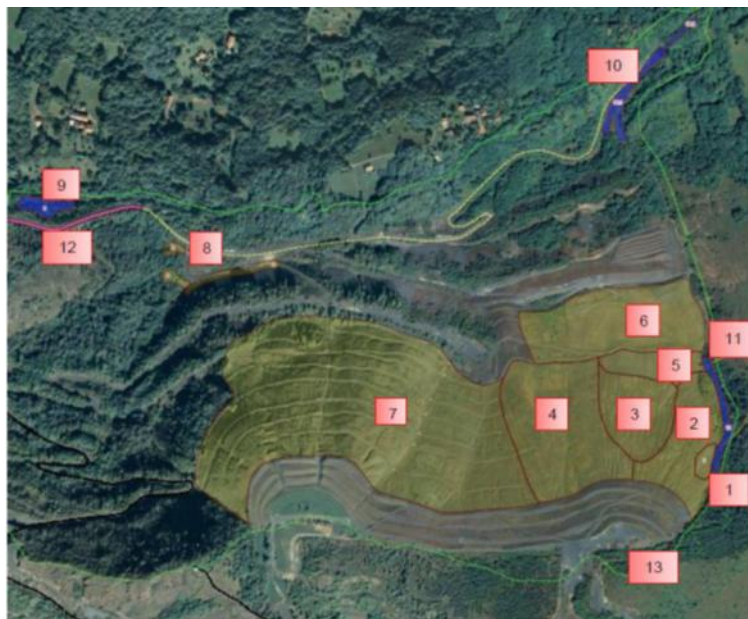

Gli Ambiti di intervento

Gli interventi, distribuiti su 13 ambiti territoriali, si sono articolati in diverse linee di lavoro tra loro coordinate. Nel settore nord-orientale, corrispondente all'Ambito 13 e interessato da un principio di dissesto, è stata rimossa la parte più critica del versante – circa 12.800 metri cubi di materiale detritico – per poi ridistribuire il materiale stesso in modo da ottenere un pendio più stabile; sulle superfici sommitali è stata realizzata una rete di regimazione idraulica mediante canalette in geomembrana, con lo scopo atteso di convogliare in modo controllato le acque piovane. Parallelamente, la viabilità interna è stata messa in sicurezza separando fisicamente il vecchio piano stradale, potenzialmente contaminato, da un nuovo strato di materiale pulito.

Sul Torrente Fandaglia sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo, sia a monte sia a valle della discarica, insieme al ripristino delle vasche di decantazione esistenti; interventi che hanno aumentato la capacità di raccolta delle acque e ridotto il rischio che il trasporto solido possa veicolare materiale contaminato verso valle. Una parte significativa del progetto ha inoltre riguardato la ricostituzione di una copertura vegetale stabile e duratura, indispensabile per "sigillare" le superfici ed eliminare il rischio di dispersione delle fibre nell'aria: attraverso l'introduzione progressiva di specie erbacee e arbustive selezionate, capaci di adattarsi anche a un terreno di per sé sfavorevole, povero di sostanza organica e con caratteristiche chimiche estreme, si è avviata la trasformazione del materiale minerario in un vero e proprio substrato fertile. Il progetto ha infine previsto la realizzazione di percorsi di accesso funzionali sia alle attività di cantiere sia alle esigenze di monitoraggio e manutenzione, e la delimitazione dell'area con recinzioni e segnaletica, a garanzia del controllo degli accessi.



Confronto tra le immagini della discarica lato Corio dopo i primi interventi



Ambito 13 Area sommitale



Ambito 10 – Torrente Fandaglia

Nelle precedenti relazioni semestrali sono stati presentati i seguenti progetti esemplari:

Relazione semestrale 31/12/2025 – AREA TEMATICA CULTURA, SETTORE DI INTERVENTO ATTIVITÀ CULTURALI (Assegnazione in anticipazione) - Museo Regionale di Scienze Naturali - Recupero spazi immobile vincolato;

Relazione semestrale 30/06/2025 - AREA TEMATICA: ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SETTORE DI INTERVENTO: EDUCAZIONE E FORMAZIONE - Misura dedicata al consolidamento delle Accademie di filiera;

Relazione semestrale 31/12/2024 - AREA TEMATICA: RIQUALIFICAZIONE URBANA - SETTORE DI INTERVENTO: EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI - Strategie Territoriali d'Area Omogenea
