

# Piattaforma programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie (PGMEAS)

Per migliorare la governance del ciclo di vita di un investimento

Torino, 12 Novembre 2024



# Indice dei contenuti

---


- 1 il contesto
- 2 i benefici attesi
- 3 il progetto
- 4 l'evoluzione e i prossimi passi

# Il contesto dell'iniziativa



# Il contesto dell'iniziativa

---



un passo cruciale per l'Assessorato alla Salute, per migliorare la qualità dei servizi e garantire una gestione più efficace delle risorse pubbliche



**digitalizzazione dei processi**  
iter autorizzativi più semplici  
procedure più veloci

**migliore pianificazione e controllo**  
maggiore trasparenza



# Il progetto: punti di forza della nuova soluzione

---

1

**digitalizzazione**

tutte le fasi dell'iter sono digitali:  
- programmazione  
- gestione  
- monitoraggio

2

**monitoraggio**

controllo costante e visione di insieme in tempo reale degli investimenti

3

**reportistica**

integrata con ecosistema delle piattaforme regionali

4

**alerting**

segnalazione tempestiva di eventuali criticità o ritardi

5

**notifiche**

per tenere informati tutti gli attori coinvolti sugli sviluppi e le scadenze

# I benefici attesi

---



## EFFICIENZA OPERATIVA

riduzione dei tempi di approvazione e **gestione delle pratiche**



## TRASPARENZA

chiarezza e accessibilità delle informazioni per **tutti gli stakeholder**



## MONITORAGGIO CONTINUO

possibilità di seguire l'andamento degli investimenti in modo **dettagliato e aggiornato**



## REATTIVITÀ

capacità di intervenire prontamente in caso di problemi, grazie al sistema di **alerting**


## Il progetto: la metodologia di lavoro

---



**incontri periodici**  
con cadenza settimanale

**validazione analisi**  
da parte di Regione Piemonte



**raccolta e analisi requisiti**  
della nuova soluzione

**data quality**  
recupero programmaz. 2023-24



Il progetto: le fasi e gli stati di avanzamento

# PROGRAMMAZIONE

## stati di avanzamento

- proposto
- finanziabile
- approvato



## Il progetto: la fase di gestione

---



**GESTIONE**

### stati di avanzamento

- Inserito
- Finanziato
- in corso d'opera

### moduli

- Modulo A
- Modulo AA
- Modulo AC
- Modulo AP
- Modulo BA
- Modulo BR
- Modulo BS
- Modulo E
- Modulo RE
- Modulo RA

Il progetto: le fasi e gli stati di avanzamento

# MONITORAGGIO

stati di avanzamento

collaudato



## Il progetto: lo stato dell'arte

---

Le funzionalità sviluppate percorrono le macrofasi del processo di raccolta e monitoraggio delle richieste di investimento, in particolare:

messa a disposizione della programmazione 2024 attraverso l'importazione dei dati sulla base dati PGMEAS

profilazione utenti

dati struttura ASR

ricerca intervento: funzionalità che permette la ricerca e la visualizzazione degli interventi

gestione: compilazione on line della richiesta di ammissione al finanziamento e caricamento dei documenti: Relazione tecnica e Provvedimento aziendale di approvazione


monitoraggio: compilazione on line del Modulo C (moduli C-S e C-R)

## Il video promozionale


---



# Il progetto: data quality della programmazione 2023 e 2024

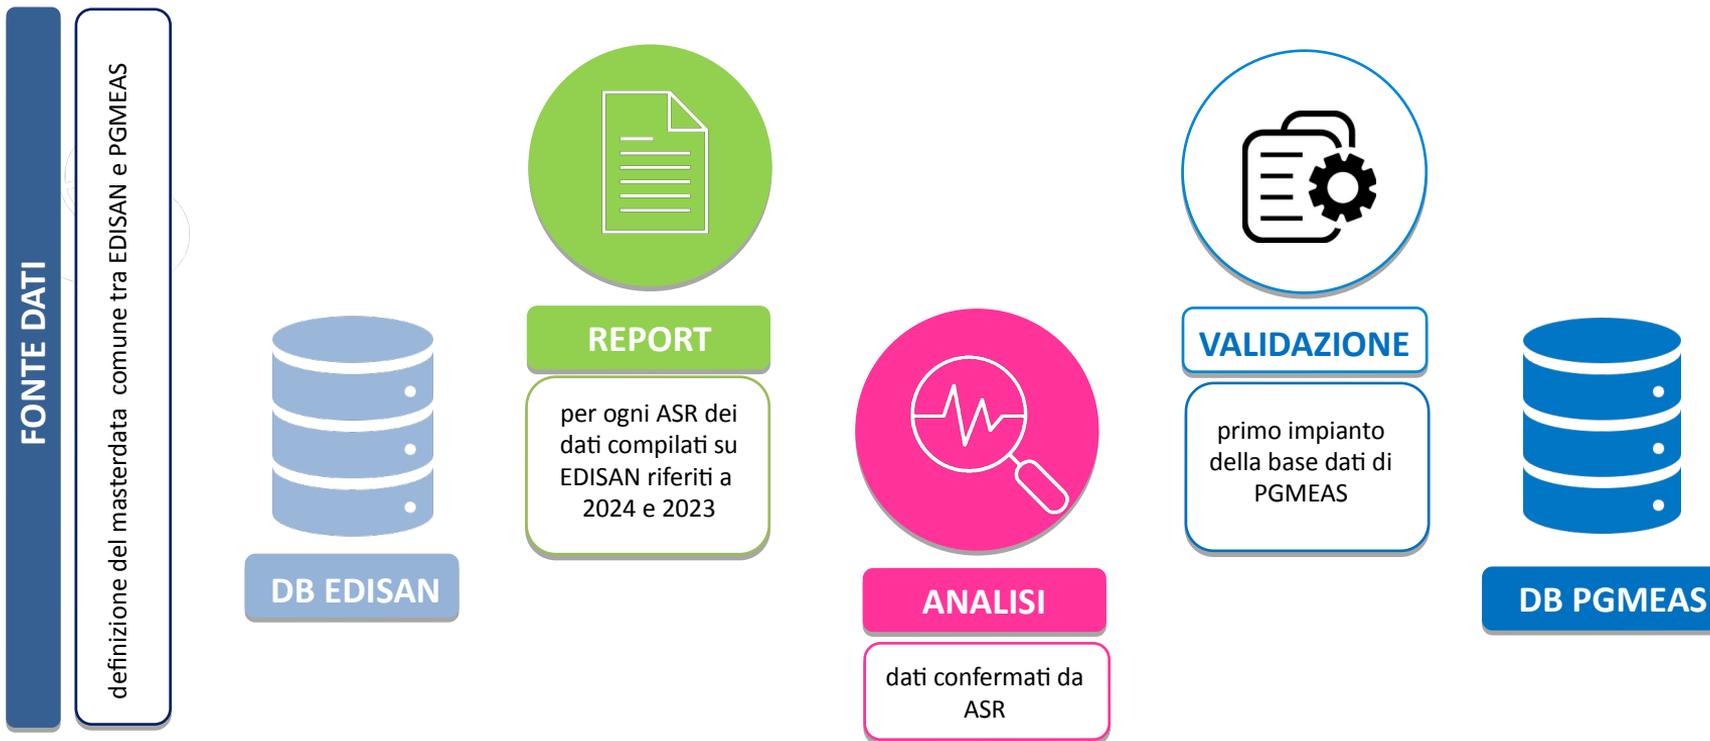

## Distribuzione per quadrante degli interventi analizzati

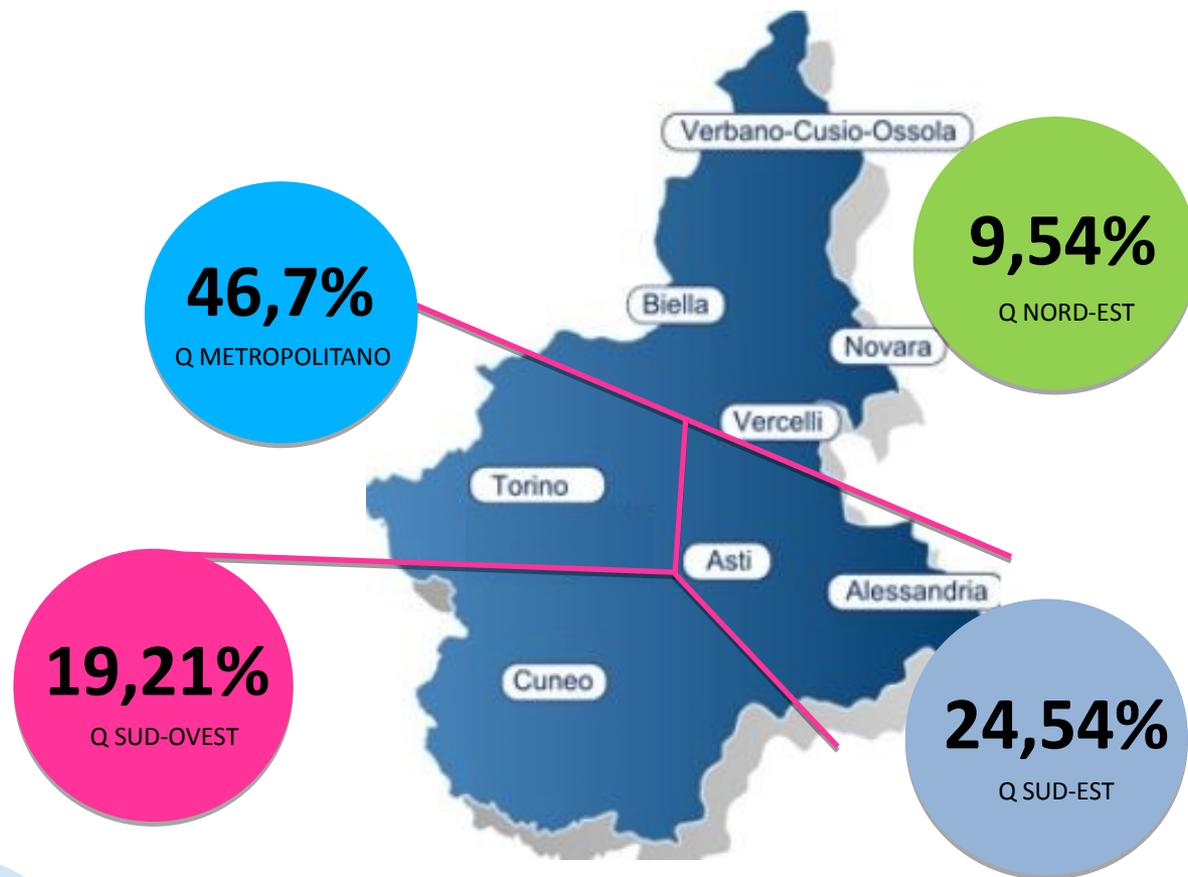


**713**

interventi nel 2024

# Distribuzione per finalità degli interventi analizzati


distribuzione interventi per Finalità  
(da EDISAN 2024 + conferma ASR)

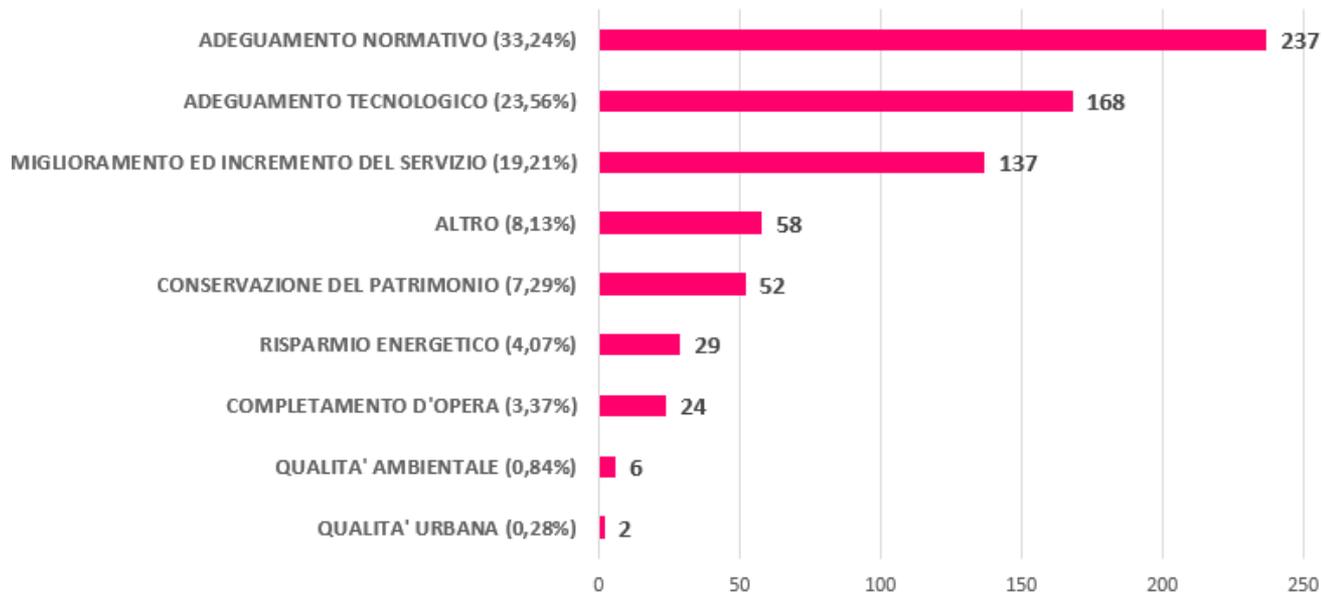

**713**  
interventi nel 2024


# Distribuzione per tipologia degli interventi analizzati

distribuzione interventi per Tipologia intervento  
(da EDISAN 2024 + conferma ASR)

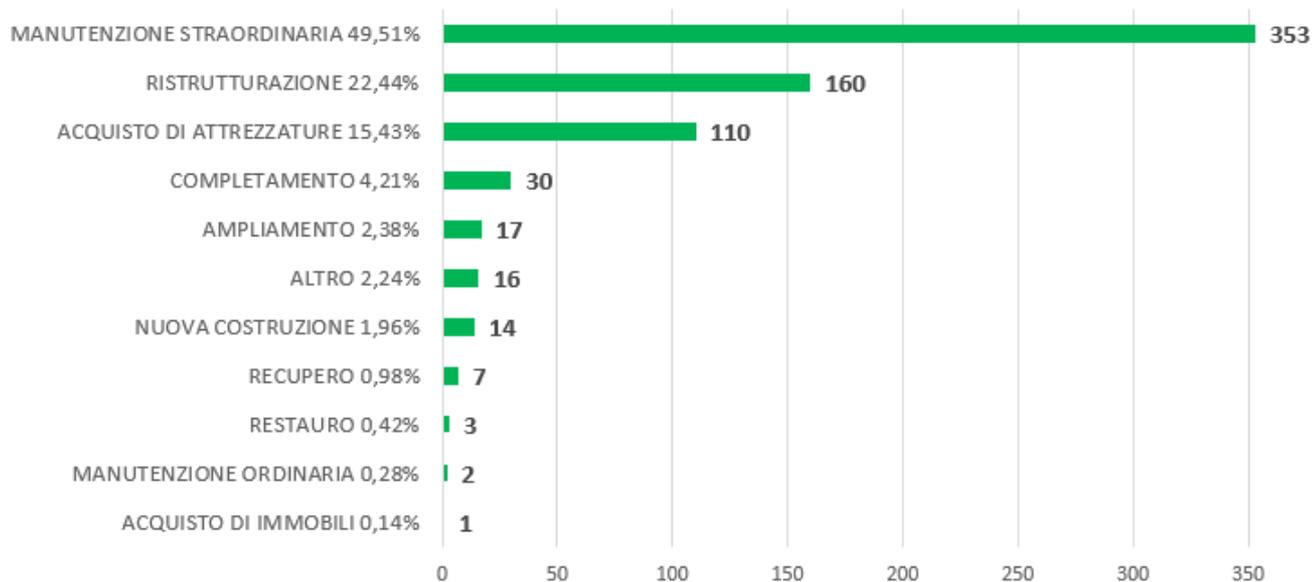

**713**  
interventi nel 2024

# L'evoluzione e i prossimi passi – la roadmap

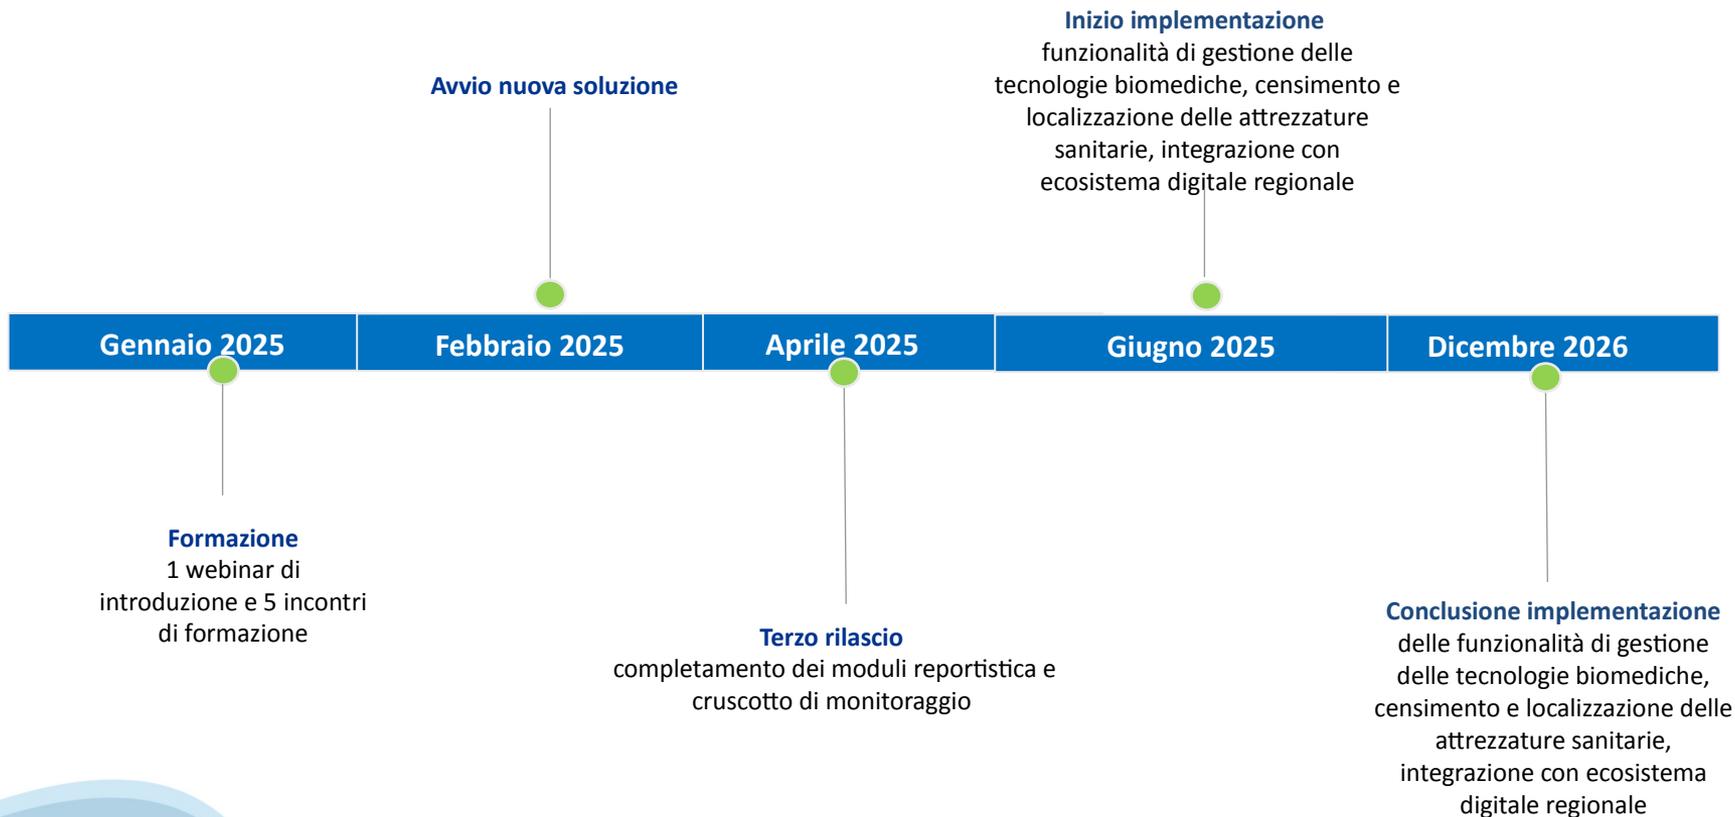

---

# Grazie

*«Il progresso è impossibile senza cambiamento e chi non può cambiare idea non può cambiare nulla»  
George Bernard Shaw*

