



**ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE**

**TRA**

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**E**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del Decreto-legge  
124/2023 e dell'art. 5, comma 2 dell'Accordo**

**3<sup>^</sup> RELAZIONE SEMESTRALE**

**dal 1° luglio al 31 dicembre 2025**

## INDICE

Premessa.....	3
Primi adempimenti.....	4
Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV).....	6
Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo .....	8
1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 ( <i>Delibera CIPESS numero 27, del 23 Aprile 2024</i> ) .....	8
2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021.....	22
Piano di comunicazione e buone prassi.....	25

## Premessa

L'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte è stato sottoscritto il 7 dicembre 2023, recepito con la Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 “Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023”.

La Delibera CIPESS n. 27/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 06-08-2024.

Il valore complessivo dell'Accordo ammonta a 865.305.613,29 euro, di cui 125.353.922,91 assegnate da delibera CIPESS 79/2021 (anticipazione), 694.215.368,32 provenienti da delibera CIPESS 25/2023 (ordinarie) e 45.736.321,96 derivano da diversi cofinanziamenti (PSC Piemonte, PNRR, risorse ordinarie nazionali, regionali e locali). Una quota dell'assegnazione FSC ordinaria, pari a 170.000.000, è stata destinata al cofinanziamento regionale del PR FESR Piemonte (ai sensi dell'art. 23, c. 1-ter, DL 152/2021).

Il sistema di governance dell'Accordo poggia su un Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza composto da quattro componenti: un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante della Regione Piemonte.

In ordine alle organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell'Accordo, fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell'Accordo è svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, sono stati individuati: come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”; come Organismo di Certificazione, il Settore regionale “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie”; come referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, “FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo”).

I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo sono stati approvati il 7 ottobre 2024 (D.D. 308/A2104B/2024), rispettando i tempi previsti dall'Accordo. Successivamente, nel mese di novembre 2025, tali documenti sono stati aggiornati (D.D. 253/A2104C/2025). La documentazione è disponibile sul sito istituzionale della Regione, a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/sistema-gestione-controllo-accordo-per-coesione-fsc-2021-2027>

## Primi adempimenti

La tabella sottostante illustra la distribuzione delle risorse dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, articolate per ambiti di intervento e fonti di finanziamento. L'investimento complessivo, inclusa la quota destinata al PR FESR Piemonte, è di 865,3 milioni di euro.

### Quadro finanziario complessivo

Tabella art. 3 Accordo per la coesione Regione Piemonte									
AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Cofinanziamento con altre risorse (*)	
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00
Riqualficazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72
<b>Totale Ambiti di Intervento</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>649.569.291,23</b>	<b>199.034,40</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>20.281.665,41</b>	<b>23.255.622,15</b>	<b>45.736.321,96</b>	<b>695.305.613,19</b>
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>694.215.368,32</b>	<b>819.569.291,23</b>						<b>865.305.613,19</b>

Le risorse provenienti da fonti diverse dal FSC ammontano complessivamente a 45.736.321,96 euro. Tali risorse, già indicate nell'Accordo, risultano confermate, come comunicato nella nota del 31 ottobre 2024 (Oggetto: Accordo per la coesione Regione Piemonte. Riscontro primi adempimenti), trasmessa in risposta alla richiesta del 25 ottobre scorso e successivamente ribadito nella relazione semestrale di monitoraggio (gennaio – giugno 2025). Nel corso dell'attuazione, l'ammontare complessivo dei cofinanziamenti potrà tuttavia aumentare in seguito ad eventuali nuovi apporti finanziari da parte dei soggetti beneficiari

Con la medesima nota del 31 ottobre 2024 si dava inoltre conferma che tutte le linee di azione erano state avviate. In particolare, nel mese di settembre 2024 si è provveduto ad individuare i Responsabili regionali di attuazione e controllo per tutte le linee di azione e gli interventi indicati nell'Accordo per la Coesione (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Per quanto riguarda le attività di selezione degli interventi, si segnala che questa fase procedurale è stata completata per le **risorse FSC assegnate in anticipazione**; tutti gli interventi hanno raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2024 e il processo di attuazione procede regolarmente. Al 31 dicembre 2025 si registrano pagamenti FSC per oltre 77 milioni, pari al 61,3% delle risorse assegnate, con un incremento di spesa di 5,5 milioni nell'ultimo semestre e di 13,4 milioni su base annuale (+21%).

Per quanto riguarda le **risorse FSC assegnazione ordinaria** si evidenzia che tutte le aree tematiche e relative linee di intervento sono state attivate (si veda il focus sulle assegnazioni). Anche per questa componente si registra un'evoluzione positiva sul piano attuativo. Il numero di interventi selezionati e identificabili con codice CUP è pari a 1253 (ultimo monitoraggio), erano 1064 a giugno 2025 e 46 a dicembre 2024. Analoga crescita anche sul versante finanziario. Al 31 dicembre 2025 risultano impegni FSC per 254,2 milioni di euro, pari al 48,2% delle risorse assegnate, evidenziando un marcato incremento sia su base semestrale che annuale (ammontavano infatti rispettivamente a 139 milioni nel giugno 2025 e a 46 milioni nel dicembre 2024). Incrementi rilevanti anche sul fronte dei pagamenti, che risultano più che raddoppiati nell'ultimo semestre, passando dai 22,4 milioni di giugno 2025 agli attuali 51,8 milioni (dicembre 2025); ancora più marcata la crescita su base annua, a fronte dei 2,2 milioni rilevati a dicembre 2024.

Si è provveduto a compilare la tabella richiesta relativa all'attuazione delle Linee di Azione, riportando per ciascuna di esse le informazioni riguardanti l'avvio, la conclusione e l'esito della procedura.

## Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV)

Il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza è composto da:

- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante della Regione Piemonte.

Il responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo è individuato nel Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei (D.G.R. 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Si sono finora avanzate quattro richieste di modificazione.

Con la **prima**, trasmessa con nota prot. 7210 del 16 aprile 2024, il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto al Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR", la modifica degli allegati all'Accordo, resasi necessaria in seguito allo spostamento, dall'Allegato A2 all'Allegato A1 dell'Accordo stesso, degli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata con le risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023, pari complessivamente a 6.659.743,44.

Con nota n. 7104 del 17 aprile 2024 il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, pur non comportando tali modifiche variazioni sostanziali ai contenuti dell'Accordo, ha sottoposto detta richiesta al Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza che non ha avanzato osservazioni al riguardo.

Con la seconda richiesta, formalizzata con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00050306 del 20 novembre 2024, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la proposta di attivazione della procedura di modifica del cronoprogramma dell'Accordo per la Coesione in ragione delle tempistiche intercorse tra la programmazione e l'effettiva assegnazione delle risorse, avvenuta soltanto in data 6 agosto 2024 con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Repubblica Italiana della delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0023675-P-10/12/2024 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, che in data 20 dicembre 2024 si è riunito per la relativa disamina.

Con nota prot. n. 55797 del 31 dicembre 2024, il Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, inviando i nuovi allegati A1, B1 e B2 e la conferma dell'allegato A2 invariato.

Con la **terza**, trasmessa con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00007765 del 21 febbraio 2025, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e

PNRR” la richiesta di attivazione della procedura scritta per la proposta di modifica degli allegati all’Accordo relativamente alla linea di azione FSCRI\_RI\_147. Tale modifica è risultata necessaria per ottimizzare le opzioni di scelta dei progetti da attivare, rendendo più efficace la selezione dei progetti strategici, di rilevanza regionale e nazionale, ricadenti nella suddetta linea d’azione. Si è confermato l’importo complessivo delle risorse assegnate alla linea d’azione, pari a 60 milioni di euro.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0003435-P-24/02/2025 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall’articolo 4 dell’Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, al quale si è chiesto di far pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre venerdì 28 febbraio 2025, con il meccanismo del silenzio assenso. In assenza di osservazioni, la proposta è stata positivamente accolta.

Infine, con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00055942 del 21 novembre 2025, è stata inviata al Ministro “Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR una **quarta** proposta di modifica” con contestuale richiesta di attivazione della procedura scritta. In particolare, si proponevano due modifiche:

- 1) Variazione del cronoprogramma di spesa, per impossibilità oggettiva di rispettare le previsioni per cause non imputabili all’amministrazione regionale o al soggetto attuatore. Le modifiche riguardavano una linea d’azione e sei interventi.
- 2) L’aggiornamento della denominazione di una linea d’azione prevista in fase di sottoscrizione dell’Accordo.

Successivamente, in data 29 dicembre 2025, la Conferenza Stato Regioni, rilevata la necessità di consentire uno slittamento dei piani finanziari degli Accordi per l’annualità 2025, in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei, nonché degli impegni assunti nella medesima Intesa, ha proposto di procedere alle modifiche dei piani finanziari mediante opportuni confronti bilaterali, nel rispetto delle vigenti procedure di modifica degli Accordi.

Si è pertanto richiesto alle Amministrazioni competenti, ove ne abbiano la necessità, di attivare la procedura di modifica degli Accordi attraverso apposita richiesta del Presidente di Regione o Provincia autonoma al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione. Per le Amministrazioni che avessero già trasmesso proposte di modifica dei cronoprogrammi degli Accordi è stato indicato di confermare i termini delle stesse o, in alternativa, di inviare una richiesta aggiornata (Nota DPCOE N. 1403-P-27.01.2026). A seguito di tali indicazioni, è stata trasmessa una **integrazione** alla **quarta proposta** di modifica con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. N. P 00000034 del 13/02/2026.

## Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo

Prosegue il percorso di attuazione del programma di interventi promosso dall'Accordo per la Coesione, sia della componente ordinaria che per gli interventi finanziati mediante anticipazioni FSC. Per questi ultimi, si segnala che tutti gli interventi hanno rispettato i termini previsti per il conseguimento delle OGV al 31 dicembre 2024.

### 1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (Delibera CIPESS numero 27, del 23 Aprile 2024)


La tabella sottostante mostra lo stato di attuazione delle risorse ordinarie nell'ambito dell'Accordo di Coesione, fornendo un quadro dell'avanzamento finanziario in relazione agli impegni e ai pagamenti. Il costo totale delle iniziative previste ammonta a oltre 609 milioni di euro, di cui circa 524 milioni derivano dal FSC 2021-2027 (quota ordinaria). I dati evidenziano il progressivo consolidamento della fase di avvio operativo in cui si trovano gli interventi. Al 30 giugno 2025, gli impegni a valere sulle risorse FSC ammontano al 48,5% delle risorse disponibili, corrispondenti a circa 254,2 milioni di euro. I pagamenti ammontano al 9,9%, per un importo pari a 51,8 milioni di euro.

#### Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione finanziario (31/12/2025)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui:		IMPEGNI FSC 21-27	IMPEGNI %	PAGAMENTI FSC 21-27	PAGAMENTI %	NUMERO INTERVENTI
		FSC 21-27	FSC 21-27					
		a	b	c=b/a	d	e=d/a		
03-COMPETITIVITA' IMPRESE	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0%			0,0%	1
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0%			0,0%	1
04-ENERGIA	23.812.365,00	23.812.365,00	4.414.013,36	18,5%	2.156.719,73		9,1%	28
04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	23.812.365,00	23.812.365,00	4.414.013,36	18,5%	2.156.719,73		9,1%	28
06-CULTURA	12.000.000,00	10.000.000,00	507.590,00	5,1%	500.446,30		5,0%	1
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	12.000.000,00	10.000.000,00	507.590,00	5,1%	500.446,30		5,0%	1
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	88.894.624,00	50.066.367,44	47.278.168,22	94,4%	160.903,10		0,3%	5
07.01-TRASPORTO STRADALE	45.488.000,00	6.659.743,44	3.871.544,22	58,1%	160.903,10		2,4%	4
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	43.406.624,00	43.406.624,00	43.406.624,00	100,0%			0,0%	1
08-RIQUALIFICAZIONE URBANA	253.054.911,53	208.168.153,16	108.274.106,57	52,0%	16.984.708,70		8,2%	937
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	253.054.911,53	208.168.153,16	108.274.106,57	52,0%	16.984.708,70		8,2%	937
10-SOCIALE E SALUTE	188.187.635,00	188.187.635,00	52.583.381,90	27,9%	32.076.539,63		17,0%	280
10.02-STRUTTURE E ATTREZZ. SANIT.	188.187.635,00	188.187.635,00	52.583.381,90	27,9%	32.076.539,63		17,0%	280
12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	3.980.847,72	3.980.847,72	1.145.858,55	28,8%	15.713,64		0,4%	1
12.02-ASSISTENZA TECNICA	3.980.847,72	3.980.847,72	1.145.858,55	28,8%	15.713,64		0,4%	1
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>609.930.383,25</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>254.203.118,60</b>	<b>48,5%</b>	<b>51.895.031,09</b>		<b>9,9%</b>	<b>1.253</b>

L'analisi evidenzia un avanzamento differenziato sul versante degli impegni e dei pagamenti nelle diverse aree tematiche. Nelle aree *Competitività imprese e Trasporti e mobilità* si registra un'elevata quota di impegni delle risorse FSC ai quali corrisponde una modesta quota di pagamenti (0,3% per *Trasporti e mobilità*). Nell'area *Riqualificazione urbana* si rilevano quote più contenute in termini di impegni FSC ma comunque superiori al 50% delle risorse assegnate mentre i pagamenti si attestano all'8,2%. Nelle aree *Energia e Sociale e salute* si rilevano impegni pari rispettivamente al 18,5% e al 27,9% delle risorse FSC a cui corrispondono tuttavia i più elevati livelli di pagamento (9,1% e 17%). *Capacità amministrativa e Cultura* presentano valori analoghi sul versante degli impegni FSC pari al 28% e al 5% delle risorse assegnate a cui conseguono quote modeste di pagamenti. In termini assoluti i valori più elevati sul versante dei pagamenti sono quelli dell'Area *Sociale e salute* (32 milioni) e *Riqualificazione urbana* (16,9 milioni)

Il grafico sottostante evidenzia il significativo avanzamento finanziario complessivo dell'Accordo. Gli impegni passano da circa 46,2 milioni di euro a oltre 254 milioni su base annuale, registrando un + 115 milioni nell'ultimo semestre (giugno dicembre 2025). Anche i pagamenti registrano una crescita consistente, passando da 2,2 milioni a oltre 51,8 milioni su base annuale, con un incremento di quasi 30 milioni nell'ultimo semestre, segnalando una netta accelerazione nella fase di realizzazione degli interventi.

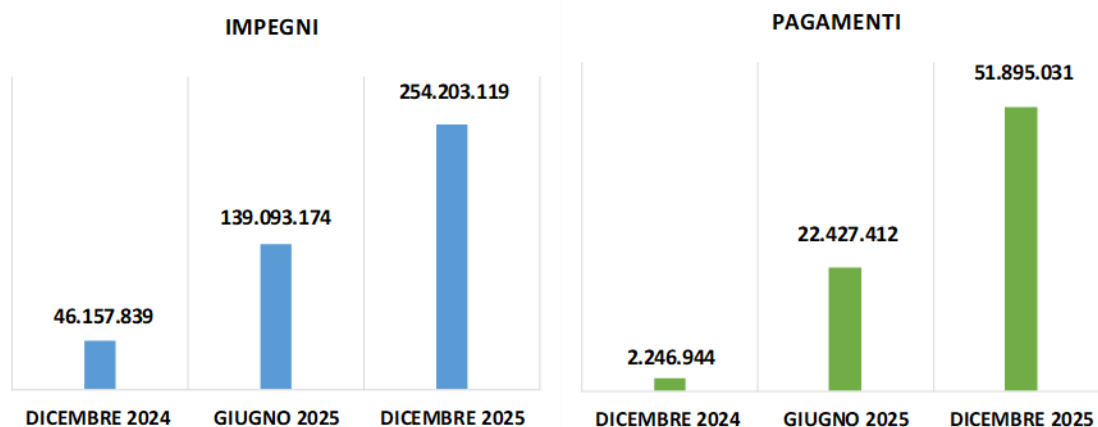

Il sensibile progresso nell'utilizzo delle risorse è tuttavia accompagnato da alcune criticità

Come rilevato anche dalla Conferenza Stato Regioni (29 dicembre 2025), alcuni interventi avviati nell'ambito dell'Accordo sono negativamente condizionati, sotto il profilo dei tempi di attuazione e di avanzamento finanziario, dalla concomitanza con i lavori previsti dal PNRR, soggetti a regole e scadenze particolarmente stringenti per la conclusione delle opere. Più in generale, la presenza simultanea, nelle agende finanziarie delle amministrazioni competenti, di molteplici programmi di investimento in corso (PNRR, POC, Accordo di Coesione, programmi strutturali europei) può generare un rilevante sovraccarico operativo per le strutture attuative, oltre a introdurre rigidità nella gestione di cassa all'interno dei bilanci (sostanziale impossibilità ad anticipare le risorse per i pagamenti).

A questo proposito era stata inviata, nel novembre 2025, al Ministro “Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR” una proposta di modifica (la quarta, vedi retro) in cui si richiedeva tra l’altro la variazione del cronoprogramma di spesa. Le modifiche riguardavano una linea d’azione e sei interventi. Tale proposta è stata successivamente integrata, sulla scorta delle indicazioni tramesse a seguito della succitata Conferenza Stato Regioni ed è attualmente in fase di istruttoria.

### **1.1 Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione procedurale**

In questo paragrafo si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti principali, e relativo stato di attuazione procedurale, delle linee di azione attivate.

#### **COMPETITIVITA' IMPRESE**

##### **Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria: incentivi per il rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi**

Costo totale: 40.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 40.000.000 – CUP J69B24000210001

Questa area tematica comprende un'unica linea d'intervento volta a favorire la rapida sostituzione degli autobus più inquinanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) con veicoli a minore impatto ambientale. L'intervento utilizza i criteri e i metodi di cui al "Programma regionale 2019–2023 degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma" ex D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 78-4445 del 22 dicembre 2021, ai fini di ottemperare alle previsioni del piano regionale di qualità dell'aria, adottato in esito alla procedura di VAS con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024, di sostituzione di almeno 100 autobus di classe emissiva fino a Euro 3 entro il 2025.

Al 31/12/2025 buona parte delle aziende beneficiarie hanno già stipulato il contratto di fornitura dei mezzi, alcune hanno già effettuato l'ordine e le restanti, per problematiche legate alla predisposizione dei capitolati di gara, effettueranno gli ordini nel corso del 2026.

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalle fonti di finanziamento finalizzate al rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso il FSC 21-27, la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 21-2058 del 22 dicembre 2025 "Legge regionale n. 1/2000. Approvazione, per il periodo 2025-2033, delle nuove disposizioni per la definizione e l'attuazione degli investimenti per il rinnovo del parco rotabile per il trasporto pubblico locale su gomma delle aziende titolari di contratto di servizio." che consente di riassegnare le risorse non utilizzate alle aziende che manifestino l'intenzione di cofinanziare maggiormente l'acquisto dei mezzi con risorse proprie e incrementarne il numero.

#### **RIQUALIFICAZIONE URBANA**

##### **Strategie territoriali d'area omogenea**

Costo totale: 115.500.000 - Importo FSC 2021-2027: 105.000.000

Con questa linea di intervento, la Regione ha avviato un percorso di programmazione integrata di sviluppo e riqualificazione territoriale. L'iniziativa si colloca in un disegno di più ampio respiro, promosso dalla Regione, volto a coinvolgere tutte le amministrazioni locali piemontesi in programmi di investimento e sviluppo finanziati, in parte, con risorse aggiuntive: Strategia Aree interne, Strategie Urbane d'Area e Strategie territoriali d'area omogenea (D.G.R. 6 febbraio 2023, n. 1-6477, Indirizzi per la programmazione regionale integrata per lo sviluppo e

la coesione territoriale nell'ambito del PR FESR 2021-2027, del FSC 2021-2027 e della programmazione di fondi regionali.

Attraverso le Strategie Territoriali d'area omogenea, una parte del territorio regionale è stata suddivisa in 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), composte da un numero variabile di comuni. Ciascuna ATO, coordinata da un soggetto capofila, elabora e attua un piano di interventi mirato a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. L'operazione coinvolge 805 amministrazioni comunali e più di 1 milione e 158mila cittadini. A seguito di una fase di condivisione con gli enti coinvolti, la Giunta regionale ha deliberato (D.G.R. n. 8152 del 12 febbraio 2024), la composizione definitiva delle 24 Aree Territoriali Omogenee nonché le modalità attuative della linea di intervento. Si sono concluse le procedure di approvazione dei programmi delle singole ATO, corredati dei relativi progetti di rilevanza comunale e sovra-locale.

Con la determinazione dirigenziale n. 157 del 31 maggio 2024 è stato attivato l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle "Strategie territoriali d'area omogenea" in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024.

A seguito dei lavori della commissione, sono stati valutati e selezionati i progetti ammissibili e tra fine novembre e dicembre 2024 sono state assunte le 24 determinazioni con l'approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria.

Successivamente alla fase di ammissibilità, i soggetti proponenti hanno richiesto i codici CUP dei progetti e predisposto una scheda con ulteriori dettagli in merito ai progetti ammessi a finanziamento.

A seguito della verifica documentale, sono stati assunti tutti gli atti di concessione relativi alle 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), di seguito elencate:

- 1 Area Alta Val Tanaro e Cebano
- 2 Area Alto Monferrato
- 3 Area Appennino alessandrino
- 4 Area Bacino del Tanaro
- 5 Area Baraggia
- 6 Area Biellese
- 7 Area Borghi delle Vie d'Acqua
- 8 Area Canavese
- 9 Area Laghi
- 10 Area Monferrato Casalese Terre di Po
- 11 Area Monferrato Heritage UNESCO
- 12 Area Monregalese
- 13 Area Novarese
- 14 Area Orco e Soana
- 15 Area Ossola
- 16 Area Pianura cuneese
- 17 Area Pianura torinese

- 18 Area Roero
- 19 Area Terra di Langa
- 20 Area Terre del Monviso
- 21 Area Terre di Langa e Monferrato
- 22 Area Val di Susa
- 23 Area Valle Stura
- 24 Area Valli Chisone e Germanasca

Tra il 27 marzo 2025 e il 22 maggio 2025 sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte le 24 determinazioni dirigenziali di concessione dei contributi, per un totale di 100 milioni di euro concessi, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/aree-territoriali-omogenee-concessione-contributi-fsc-2021-2027>

Nel corso del 2025, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate delibere, si è avviata la fase di programmazione delle risorse premiali, pari a 5.000.000 euro, per quei piani di sviluppo in grado di attivare ricadute territoriali di area vasta: con la D.G.R. n14- 1108 del 12 maggio 2025 sono stati approvati i criteri per l'attribuzione delle risorse.

Sono state individuate tre fasce di merito, con relative risorse assegnate, in ragione dell'obiettivo di sollecitare dinamiche di programmazione d'area su tutto il territorio regionale:  
300.000 euro: per le aree che nella valutazione hanno ottenuto un punteggio sopra i 75 punti  
200.000 euro: tra i 50 e i 75 punti;  
150.000 euro: sotto i 50 punti.

Con la D.D. 326 del 18/12/2025 sono stati ammessi 42 progetti al finanziamento con le risorse premiali attribuite sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R n. 14-1108 del 12 maggio 2025 per totale, comprensivo di cofinanziamento di 6.740.745 euro; 2 progetti ammessi al finanziamento con le risorse non programmate nella prima fase quantificate in 250.558,65 euro.

Nel contempo, la Regione, in collaborazione con l'IRES Piemonte e sulla base delle proposte presentate dal territorio, ha predisposto un dossier che riporta, per ogni ATO, i principali indicatori socio economici e le strategie emergenti dai progetti proposti dalle amministrazioni locali.

Sono in fase di elaborazione gli atti e gli allegati collegati allo schema di accordo quadro, uno per ogni ATO, la cui sottoscrizione è prevista per i primi mesi del 2026 e vedrà coinvolti gli 805 enti locali che hanno partecipato alle attività di programmazione.

La linea di intervento risulta già in fase di attuazione, anche se in diversa misura tra le singole Aree Territoriali Omogenee (cfr. tabella). In base all'ultimo monitoraggio, si registra una spesa FSC superiore a 9 milioni di euro (quasi il 10% delle risorse FSC assegnate).

AREA TERRITORIALE OMOGENEA (ATO)	IMPORTO CONTRIBUTIVO FSC 21-27	SPESA FSC 21-27 (dicembre 2025)	% di Spesa raggiunta
01 Area Alta Valle Tanaro e Cebano	2.386.429,50	115.287,66	4,83%
02 Area Alto Monferrato	5.700.063,00	397.148,27	6,97%
03 Area Appennino alessandrino	3.105.245,20	166.958,54	5,38%
04 Bacino del Tanaro	4.765.728,39	489.025,15	10,26%
05 Area Baraggia	2.940.763,82	283.294,94	9,63%
06 Area Biellese	5.973.151,00	652.352,36	10,92%
07 Area Borghi delle Vie d'Acqua	7.136.100,00	924.835,47	12,96%
08 Area Canavese	8.887.004,45	589.341,22	6,63%
09 Area Laghi	6.206.759,55	558.399,42	9,00%
10 Area Monferrato Casalese e Terre di Po	7.723.313,58	754.344,01	9,77%
11 Area Monferrato Heritage UNESCO	4.547.400,00	313.022,12	6,88%
12 Area Monregalese	4.248.607,00	242.729,67	5,71%
13 Area Novarese	4.977.709,92	663.639,80	13,33%
14 Area Orco e Soana	4.099.002,68	378.197,70	9,23%
15 Area Ossola	2.867.580,30	177.802,01	6,20%
16 Area Pianura cuneese	3.698.202,00	249.782,45	6,75%
17 Area Pianura torinese	3.991.122,00	233.316,09	5,85%
18 Area Roero	2.822.654,00	256.853,73	9,10%
19 Area Terra di Langa	2.783.375,00	512.205,86	18,40%
20 Area Terre del Monviso	2.923.435,74	161.638,42	5,53%
21 Area Terre di Langa e Monferrato	5.272.738,00	439.685,97	8,34%
22 Area Val di Susa	2.650.744,54	834.140,72	31,47%
23 Area Valle Stura	2.919.743,10	339.001,28	11,61%
24 Area Valli Chisone e Germanasca	2.237.860,00	162.635,85	7,27%
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>104.864.732,77</b>	<b>9.895.638,70</b>	<b>9,44%</b>

### Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli accordi di programma

Costo totale: 34.849.287,56 - Importo FSC 2021-2027: 31.749.287,56

Attraverso questa seconda linea di intervento, la Regione, in collaborazione con alcune amministrazioni locali, ha definito sei Accordi di programma composti da interventi mirati a soddisfare le esigenze di sviluppo delle comunità locali, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale e il rispetto dei principi della programmazione FSC 2021-2027.

Il percorso che ha portato all'attivazione della linea d'azione e alla sottoscrizione degli accordi di programma si è articolato nei seguenti passaggi.

Con D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 sono state approvate, per il triennio 2023-2025, le disposizioni relative all'Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale. A tale iniziativa è stata destinata una dotazione iniziale di 3.000.000 euro, suscettibile di successiva integrazione attraverso risorse provenienti da fondi regionali, fondi FSC del PSC Piemonte (Piano di Sviluppo e Coesione 2000/2020) e dalle assegnazioni della programmazione FSC 2021-2027.

Con D.D. n. 246 del 3 agosto 2023 è stata disposta l'attivazione dell'Avviso, definendo nel dettaglio tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle domande. Successivamente, con D.D. n. 360 del 30 ottobre 2023, a seguito delle valutazioni condotte da un'apposita commissione, sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse e non ammesse.

Con D.G.R. 67-7973 del 18 dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi di carattere generale sulla collocazione degli interventi di sviluppo locale da realizzare mediante lo strumento dell'accordo di programma, in attuazione della D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Coesione Piemonte, sono state integrate le risorse. A seguito della pubblicazione della delibera CIPESS n. 27 del 2024 di assegnazione delle risorse, si sono perfezionati gli atti per l'avvio dei progetti, come di seguito specificato:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 settembre 2024, n. 37 Dlgs 267/2000, articolo 34. DGR n. 72-7370 del 31 luglio 2023, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dell'Accordo di programma con i Comuni di Venaria Reale, Mango, Acqui Terme, Cossato e Monale per la realizzazione di interventi di sviluppo locale sottoscritto in data 8 Agosto 2024. Risorse pari ad euro 4.287.326,04;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 14-490  
D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area Lanzo e Canavese** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Foglizzo, Lanzo Torinese, Locana, Nole, Rivarolo Canavese e Viù. Risorse pari ad euro 4.570.500,00;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 15-491  
D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante nord est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Massino Visconti, Palazzolo Vercellese, Rimella, Ronsecco, Rosazza e Varallo. Risorse pari ad euro 3.196.593,96;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 16-492  
D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante sud est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Castellero, Castelnuovo Scrivia, Monleale e l'unione Montana Valli Borbera e Spinti. Risorse pari ad euro 2.457.931,80;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 17-493  
D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area sud ovest metropolitano** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della

Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bibiana, Carmagnola, Orbassano, Poirino, Rivalta di Torino, Sangano e Villar Perosa. Risorse pari ad euro 3.336.254,78;

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 18-494

D.lgs. n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Territorio delle valli cuneesi** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo. Risorse pari ad euro 5.114.417,66;

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2025, n. 8-1050

FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023. CIPESS n. 27/2024. Linea d'intervento "Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli Accordi di programma". Disposizioni, per un importo pari ad euro 1.200.000,00, per lo scorrimento della graduatoria approvata, in attuazione alla D.G.R. n. 67-7973 del 18 dicembre 2023.

Al monitoraggio del 31/12/2025 la linea registra impegni FSC per 15,7 milioni di euro e pagamenti FSC per 4,8 milioni di euro.

### **Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando**

Costo totale: 60.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 60.000.000

Questa linea di intervento sostiene progetti di investimento per stazioni sciistiche al fine di potenziare l’attrattività turistica del territorio montano. Suddivisi per ambiti territoriali che comprendono la Provincia di Cuneo, la Città Metropolitana di Torino e le altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania e Alessandria), gli interventi finanziabili riguardano la sostituzione, la realizzazione e il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, includendo attrezzature, opere accessorie e bacini idrici.

Le procedure per la selezione dei progetti da finanziare sono state avviate con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 18 ottobre 2024, n. 6 - 272 e del 21 novembre 2024, n. 9 - 397.

Con D.G.R. n. 6 - 272 del 18 ottobre 2024, la Giunta regionale ha approvato, in ottemperanza all’articolo 6, comma 5, del sopra citato Accordo per la coesione ed ai sensi della legge regionale n.2/2009 e del decreto legge n. 124/2023, i primi indirizzi per l’erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l’investimento “Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando” (cod. ID FSCRI\_RI\_147), stabilendo una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad euro 50.000.000,00.

Con D.G.R. n. 9-397 del 21 novembre 2024, nell’ambito del suddetto «Accordo per la Coesione», la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi

agli Enti locali piemontesi finalizzati a sostenere gli interventi in parola, con una spesa regionale complessiva massima pari ad euro 50.375.000,00.

Con D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025 la Giunta regionale ha approvato le modifiche dell'allegato A alla D.G.R. n. 9 - 397 del 21 novembre 2024, recependole in un testo coordinato riportato nell'allegato Abis e demandando alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

In attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica con D.D. n. 532 del 27/12/2024, ha provveduto:

- ad approvare l'offerta di servizio e lo schema di contratto da stipulare con Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione dei servizi connessi all'indizione, gestione e controllo del bando di assegnazione dei contributi in argomento, a fronte delle risorse già stanziare con D.G.R. 6 - 272 del 18 ottobre 2024;
- ad impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. l'importo di euro 50.000.000,00, a titolo di trasferimento per la copertura dell'erogazione di contributi agli enti locali piemontesi finalizzati a sostenere l'investimento "Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando", secondo la seguente ripartizione:
  - euro 6.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2025;
  - euro 44.000.000,00 sul cap 281270, annualità 2026.

L'ufficio ha quindi formalizzato il contratto di servizio con Finpiemonte SpA per la gestione del bando in argomento per un totale di euro 310.349,44 (IVA inclusa); il contratto è stato sottoscritto il 29/4/2025 ed è stato repertoriato con numero 274/2025.

Con D.D. n. 137 del 13/05/2025, il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ha provveduto:

- all'approvazione del "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030";
- all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, stabilendo che le istanze dovevano essere presentate esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo "FINanziamenti DOMande", entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento.

Con D.D. 277 del 30.7.2025 sono stati nominati i due funzionari regionali quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze di contributo a valere sul "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 – 2030" di cui alla D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025.

La commissione di valutazione delle istanze si è riunita il 31 luglio 2025 presso Finpiemonte S.p.A. per la prima seduta di insediamento, nella quale si è stabilito che la stessa è composta da 3 membri, di cui un funzionario indicato da Finpiemonte S.p.A. e due funzionari indicati dalla Regione Piemonte.

La commissione di valutazione, preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle domande di contributo risultavano pervenute 50 proposte progettuali, ha stabilito di

istruire le domande pervenute valutando gli ambiti territoriali nel seguente ordine: TORINO, ALTRE Province piemontesi (VC, BI, VB, AL), CUNEO, esaminando in prima battuta tutte le domande relative allo sci di discesa e, a seguire, quelle relative allo sci di fondo.

Conclusa la valutazione delle domande di contributo relative allo sci di discesa e allo sci di fondo, la commissione ha stilato le apposite graduatorie e il Settore regionale competente ha formalizzato l'assegnazione dei contributi attraverso 4 successive determinazioni dirigenziali:

- con D.D. 535 del 20.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale TORINO;
- con D.D. 536 del 20.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale ALTRE Province piemontesi (VC, BI, VB, AL);
- con D.D. 541 del 21.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di discesa, ambito territoriale CUNEO;
- con D.D. 544 del 21.11.25 sono stati assegnati i contributi ai beneficiari per lo sci di FONDO.

Con D.D. 763 del 31.12.2025, si sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese relative ai progetti beneficiari dei contributi regionali a valere sul "Bando investimenti Sistema Neve della Regione Piemonte 2025 - 2030", nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 9 - 397 del 21 novembre 2024 e dalla D.G.R. n. 29 - 1081 del 6 maggio 2025; in particolare, si è precisato che i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute unitamente a tutta la documentazione richiesta nelle tempistiche previste dal bando (entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 30/06/2030).

Sono stati ricordati i termini di esecuzione delle opere, ossia che i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla stipula del contratto con l'appaltatore o dalla stipula del contratto PPP, con eventuali proroghe fino a 12 mesi a fronte di motivata richiesta (termine ultimo 21/02/2030).

È stato inoltre specificato che le rendicontazioni dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo della Piattaforma Bandi alla quale si può accedere all'indirizzo web: <http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/bandi>, chiarendo che l'utilizzo di tale piattaforma è finalizzato alla rilevazione delle spese e alla successiva formalizzazione della dichiarazione di spesa.

Si rileva infine che è stata formalizzata la destinazione di 300.000,00 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027 per un progetto di manutenzione straordinaria e ripristino della rete sentieristica tramite un accordo con il Cai.

## **ENERGIA – SOCIALE E SALUTE**

### **Linee di intervento e quadro programmatico**

Nell'ambito della programmazione FSC 2021–2027, sono state attivate tre linee di azione rivolte alle strutture sanitarie regionali:

- Riqualificazione energetica – costo totale euro 23.812.365 (FSC 2021–2027: euro 23.812.365);
- Ammodernamento del parco tecnologico – costo totale euro 47.696.321 (FSC 2021–2027: euro 47.696.321);
- Potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale e ospedaliera – costo totale euro 140.491.314 (FSC 2021–2027: euro 140.491.314).

Le suddette linee sono state avviate con D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024, in attuazione del Decreto-legge 124/2023 e della Delibera CIPESS 25/2023, recante indirizzi per l'avvio delle azioni afferenti agli ambiti “Sociale e salute” ed “Energia”, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione sottoscritto il 7 dicembre 2023 tra il Governo e la Regione Piemonte. Il provvedimento ha approvato gli indirizzi per l'individuazione e l'attuazione degli interventi, per un macro progetto di rilancio della sanità pubblica di importo complessivo pari a euro 212.000.000.

Con D.D. n. 547 del 07/08/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione, da parte degli Enti del SSR, delle proposte di intervento, disciplinando l'istruttoria regionale articolata nelle seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità e ammissibilità del soggetto proponente e dell'intervento;
- valutazione tecnico-finanziaria e di merito, comprensiva dell'eventuale attribuzione di premialità.

### **Attuazione nel 2024 e primo semestre 2025**

Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 le Aziende Sanitarie Regionali (ASR) hanno fornito indicazioni in merito ai progetti di investimento. Nel primo semestre 2025 si è provveduto ad ammettere a finanziamento la prima quota di interventi a valere sulle risorse FSC 2021–2027 (in attuazione della citata D.D. 547/2024)

Con D.D. n. 98 del 25/02/2025 - avente ad oggetto “D.D. 547 del 07/08/2024. Ammissione degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto Rilancio della sanità pubblica (..)” - sono stati ammessi a finanziamento i primi interventi delle ASR piemontesi per un importo complessivo pari a euro 102.394.371,96, ripartito tra le tre macro-linee previste.

Con D.D. n. 176 del 30/03/2025 è stato inoltre recepito il Si.Ge.Co., comprensivo dei relativi allegati. La succitata D.D. è stata successivamente trasmessa alle A.S.R. piemontesi con nota regionale prot. 8216 del 01/04/2025.

Nel corso del 2025, con appositi provvedimenti, si è inoltre proceduto ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e a finanziare ulteriori progetti urgenti. In particolare, gli atti amministrativi di rimodulazione-integrazione sono stati i seguenti:

- D.D. n. 247 del 24/04/2025: ammissione di quattro nuovi interventi per l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (con la già citata D.D. n. 98 del 25/02/2025);
- D.D. n. 253 del 28/04/2025: rettifica di un CUP relativo a intervento dell'ASL Cuneo 1.

### **Attuazione secondo semestre 2025**

Nel secondo semestre 2025 la Direzione Sanità ha proseguito l'attuazione del programma. Sono stati ammessi a finanziamento nuovi interventi per un importo totale pari a euro 45.202.840,46, destinati al rafforzamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e delle dotazioni del sistema sanitario regionale, nonché al miglioramento dei livelli di sicurezza, efficienza e qualità dei servizi erogati. Le relative ammissioni a finanziamento sono state formalizzate mediante i seguenti provvedimenti:

1. D.D. n. 384/A1400B del 11/07/2025 – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: euro 250.000,00;
2. D.D. n. 385/A1400B del 11/07/2025 – ASL di Asti: euro 1.600.000,00;
3. D.D. n. 459/A1400B del 31/07/2025 – ASL di Biella, ASL Cuneo 2, ASL Città di Torino per un totale di euro 3.465.200,00;
4. D.D. n. 879/A1400B del 23/12/2025 – diverse ASR per un totale di euro 35.856.040,46;
5. D.D. n. 905/A1400B del 29/12/2025 – nuovi interventi dell'AO Ordine Mauriziano per euro 4.031.600,00.

Alla data attuale, le risorse complessivamente ammesse a finanziamento sulle tre linee FSC ammontano a euro 143.565.612,42. In particolare:

- la linea relativa al potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale assorbe la quota più rilevante delle risorse, con interventi ammessi per un totale di euro 85.591.066,09, confermando il ruolo strategico attribuito al rafforzamento dell'assistenza territoriale e all'integrazione con la rete ospedaliera
- la linea di ammodernamento del parco tecnologico, per la quale risultano ammessi a finanziamento interventi per complessivi euro 43.579.035,37, finalizzati al rinnovo e all'aggiornamento delle dotazioni sanitarie e tecnologiche delle strutture del Servizio Sanitario Regionale
- la linea dedicata alla riqualificazione energetica evidenzia un ammontare ammesso pari a euro 14.395.510,96, a sostegno di interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi delle infrastrutture sanitarie.

Nel loro insieme, tali importi delineano un quadro di allocazione delle risorse FSC equilibrato e coerente con gli obiettivi di rafforzamento strutturale, innovazione e sostenibilità del sistema sanitario regionale.

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio, il Settore A1416D – Controllo di gestione e sistemi informativi della Direzione Sanità ha garantito la continuità delle attività nelle more della piena operatività del sistema ministeriale, adottando soluzioni organizzative transitorie, tra cui l'attivazione di una piattaforma cloud per il caricamento della documentazione necessaria.

## **CAPACITA' AMMINISTRATIVA**

Assistenza Tecnica FSC 2021-2027 – Costo totale e Importo FSC 2021-2027: 3.980.847,72

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 3 comma 3, che nell'ambito delle risorse assegnate, l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 3.980.847,72 a valere sulla dotazione ordinaria - inferiore alla misura massima del 4 per cento del FSC 2021-2027 al lordo delle anticipazioni ma al netto del cofinanziamento dei Programmi Regionali europei – sia destinato all'assistenza tecnica a supporto della gestione e attuazione dell'Accordo. La linea di azione è finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni dell'Accordo.

La D.G.R. n. 24-207 del 27 settembre 2024, prendendo atto di quanto definito dalla Delibera CIPESS 27/2024, ha individuato il settore Programmazione Negoziata quale Responsabile dell'attuazione della linea di azione nonché Autorità di Gestione dell'Accordo, e il settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli quale Responsabile dei Controlli.

Con D.G.R. n. 30-212 del 27 settembre 2024 “Iscrizione di fondi statali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, ai sensi della Deliberazione CIPESS n. 27/2024” sono state stanziare le risorse sul bilancio regionale afferenti a tale linea di azione pari a euro 3.980.847,72.

Nel mese di ottobre 2024 è stato acquisito il CUP J69B24000240001 e sono state avviate le attività per definire soluzioni e fabbisogni organizzativi relativi alla gestione, valutazione e monitoraggio degli interventi e delle linee di azione dell'Accordo.

Al 31.12.2024 è stato sottoscritto il primo contratto con Finpiemonte per la gestione del bando di erogazione contributi agli enti locali piemontesi per sport montani e sono impegnate risorse per un totale di euro 310.349,44.

Nel corso del primo semestre 2025 sono state avviate ulteriori procedure per i seguenti affidamenti:

- servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione dell'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte FSC 2021-2027;
- stipula contratto con IRES Piemonte per l'attività di collaborazione alla redazione delle relazioni semestrali di attuazione, nonché per lo svolgimento di analisi e approfondimenti tematici e settoriali a supporto dell'attuazione dell'Accordo 2021-2027;
- avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi tecnico-professionali di comunicazione pluriennale integrata per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 21-27, per il triennio 2025 - 2027.

## 2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021


La tabella sottostante offre una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento finanziario degli interventi promossi con le Anticipazioni FSC. Sotto il profilo procedurale, si segnala che **tutti gli interventi hanno rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle OGV** al 31 dicembre 2024. Nel corso del 2025 i trasferimenti a valere sulle risorse Anticipazione FSC ammontano a 44.289.691,15 euro. Per quanto riguarda il profilo finanziario, si rileva nel complesso un buon livello di avanzamento. Gli impegni raggiungono il 98% dell'importo assegnato, con un valore pari a circa 122,8 milioni di euro su 125,3 milioni disponibili; la quota dei pagamenti si attesta al 61%, pari a circa 77 milioni di euro, evidenziando un avanzamento significativo anche per la fase di realizzazione degli interventi.

### Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: stato di attuazione finanziaria (31/12/2025)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui:	IMPEGNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	NUMERO INTERVENTI
		FSC 21-27	FSC 21-27	%	FSC 21-27	%	
		a	b	c=b/a	d	e=d/a	
<b>02-DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>12.202.327,02</b>	<b>93,9%</b>	<b>9.555.021,49</b>	<b>73,5%</b>	<b>2</b>
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000,00	13.000.000,00	12.202.327,02	93,9%	9.555.021,49	73,5%	2
<b>03-COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>24.157.466,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>22.737.026,19</b>	<b>96,8%</b>	<b>20.069.584,51</b>	<b>85,4%</b>	<b>7</b>
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	24.157.466,00	23.500.000,00	22.737.026,19	96,8%	20.069.584,51	85,4%	7
<b>05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>2.522.453,41</b>	<b>1.837.822,91</b>	<b>1.828.636,84</b>	<b>99,5%</b>	<b>1.815.687,52</b>	<b>98,8%</b>	<b>13</b>
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500,00	199.500,00	190.315,55	95,4%	182.815,55	91,6%	3
05.04-BONIFICHE	2.322.953,41	1.638.322,29	1.638.321,29	100,0%	1.632.871,97	99,7%	10
<b>06-CULTURA</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.870.910,03</b>	<b>94,0%</b>	<b>3.092.986,02</b>	<b>29,5%</b>	<b>2</b>
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.803.977,36	96,1%	321.452,19	6,4%	1
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,1%	2.771.533,83	50,4%	1
<b>07-TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.590.969,00</b>	<b>1.359.740,16</b>	<b>85,5%</b>	<b>425.791,43</b>	<b>26,8%</b>	<b>1</b>
07.01-TRASPORTO STRADALE	6.000.000,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,5%	425.791,43	26,8%	1
<b>11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>74.971.024,00</b>	<b>74.925.131,00</b>	<b>74.887.321,06</b>	<b>99,9%</b>	<b>42.067.701,90</b>	<b>56,1%</b>	<b>57</b>
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	74.887.321,06	99,9%	42.067.701,90	56,1%	57
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>131.150.943,41</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>122.885.961,30</b>	<b>98,0%</b>	<b>77.026.772,87</b>	<b>61,4%</b>	<b>82</b>

Un'analisi per area tematica evidenzia qualche differenza solo sul versante dei pagamenti. Per quanto riguarda gli impegni, infatti, coerentemente con il dato complessivo, tutte le aree presentano valori molto elevati, prossimi all'assorbimento totale delle risorse FSC (il valore relativamente più contenuto si rileva nell'area *Trasporti e mobilità*, con impegni pari a 85,5%). I dati relativi ai pagamenti segnalano qualche differenza tra le aree. In particolare, si registrano quote molto elevate di pagamenti nelle aree *Digitalizzazione* (73,5%), *Competitività imprese* (85,4%) ed *Ambiente e risorse naturali* (98,8%). Più contenuta la quota pagamenti nell'area *Istruzione e formazione* (56,1%), nella quale tuttavia si concentra il maggior valore in termini assoluti (oltre 42 milioni di pagamenti). Nelle aree *Cultura* e *Trasporti e mobilità* i pagamenti si attestano a valori di poco inferiori al 30% delle risorse FSC assegnate.

Il grafico sottostante illustra l'andamento finanziario degli interventi sostenuti attraverso le anticipazioni su base annuale e semestrale. In un contesto in cui la fase di impegno delle risorse può ormai considerarsi pressoché conclusa, con il 98% delle disponibilità del FSC già allocate, gli impegni sono sostanzialmente allineati al valore registrato nel giugno 2025 (122,8 milioni). Sul versante dei pagamenti si rileva uno sviluppo positivo, con un incremento di circa il 20% su base annuale, si è infatti passati dai 63,5 milioni del dicembre 2024 agli attuali 77 milioni, distribuiti in modo sostanzialmente equilibrato nei due semestri.

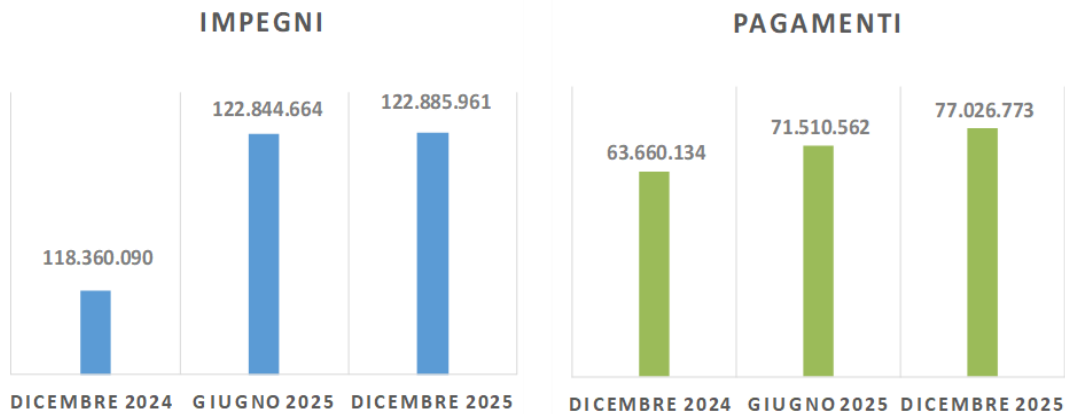

Infine, se prendiamo in esame l'avanzamento procedurale, si rilevano quote significative di interventi conclusi nei settori *Bonifiche* ed *Educazione e formazione*.

#### Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: interventi conclusi (31/12/2025)

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	INTERVENTI (n°)	di cui conclusi	
				(n°)	valore FSC
<b>02-DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2</b>		
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000,00	13.000.000,00	2		
<b>03-COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	<b>24.157.466,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>7</b>		
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	24.157.466,00	23.500.000,00	7		
<b>05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>2.522.453,41</b>	<b>1.837.822,91</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1.230.471,12</b>
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500,00	199.500,00	3		
05.04-BONIFICHE	2.322.953,41	1.638.322,29	10	6	1.230.471,12
<b>06-CULTURA</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>2</b>		
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000,00	5.000.000,00	1		
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000,00	5.500.000,00	1		
<b>07-TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.590.969,00</b>	<b>1</b>		
07.01-TRASPORTO STRADALE	6.000.000,00	1.590.969,00	1		
<b>11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>74.971.024,00</b>	<b>74.925.131,00</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>36.000.735,06</b>
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.971.024,00	74.925.131,00	57	30	36.000.735,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>131.150.943,41</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>82</b>	<b>36</b>	<b>37.231.206,18</b>

In allegato si riporta la tabella aggiornata con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle diverse linee di azione attivate (del 79\_21\_dettagli).

## Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi

## Assegnazione in anticipazione FSC – Dettaglio interventi

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.
					a	b	c=b/a	d	e=d/a
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00	5.500.000,00	4.986.277,60	90,66%	3.647.375,37	66,32%
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00	7.500.000,00	7.216.049,42	96,21%	5.907.646,12	78,77%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti pubblici che gestiscono impianti ciclistici	1.657.466,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	50,00%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti non profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00	6.000.000,00	5.852.289,39	97,54%	4.941.802,34	82,36%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00	11.966.763,00	11.966.763,00	100,00%	11.895.942,00	99,41%
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00	4.500.000,00	3.917.973,80	87,07%	2.731.840,17	60,71%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COMUNI DI CASTELLETO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00	46.504,06	46.504,06	100,00%	46.504,06	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00	24.811,49	24.811,49	100,00%	24.811,49	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%	111.500,00	93,70%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79	192.748,79	192.748,79	100,00%	192.748,79	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	27.276,34	21.058,96	21.058,96	100,00%	21.058,96	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	770.000,00	316.838,95	316.838,95	100,00%	316.838,95	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	85.932,35	67.628,93	67.628,93	100,00%	67.628,93	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo e frazione San Bovo	111.058,17	45.343,00	45.343,00	100,00%	45.343,00	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Resano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50	13.422,50	13.422,50	100,00%	7.973,18	59,40%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di intervento 13	844.560,00	844.558,38	844.558,38	100,00%	844.558,38	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000110006.	29.349,26	19.072,90	19.072,90	100,00%	19.072,90	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	50.606,00	34.702,26	34.702,26	100,00%	34.702,26	100,00%
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	B35I180000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	198.000,00	82.946,62	82.946,62	100,00%	82.946,62	100,00%
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	E88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Anoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00	5.000.000,00	4.803.977,36	96,08%	321.452,19	6,43%
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.066.932,67	92,13%	2.771.533,83	50,39%
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 - Tratta Benevagienna - Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	6.000.000,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85,47%	425.791,43	26,76%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00	38.932.479,00	38.932.479,00	100,00%	6.112.859,84	15,70%
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	36.038.543,00	35.954.842,06	35.954.842,06	100,00%	35.954.842,06	100,00%
				131.150.943,41	125.273.689,90	122.885.961,30		77.026.772,87	

## Piano di comunicazione e buone prassi

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 8 che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo stesso siano pubblicizzate sulla base di un Piano di comunicazione predisposto dalla Regione.

Il Piano di comunicazione è pubblicato nella sezione FSC del sito regionale alla pagina Programmazione FSC 2021-2027. Piano di comunicazione.

Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, con DGR n. n. 24-207 del 27 settembre 2024 la Giunta regionale ha nominato quale referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

Le attività di informazione e pubblicizzazione dell'Accordo incidono in particolar modo sulla trasparenza, sulla diffusione dei risultati e sulla valorizzazione dei progetti più significativi, con particolare riferimento alle azioni ritenute strategiche per la realizzazione complessiva dell'Accordo. Le comunicazioni rivolte ai beneficiari/soggetti attuatori, ai potenziali beneficiari/soggetti attuatori e, in generale, al pubblico anche da parte dei beneficiari/soggetti attuatori, devono contenere i seguenti loghi:



Gli interventi dell'Accordo, monitorati sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto. Le relazioni semestrali, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per l'Accordo, sono rese disponibili sul sito web della Regione Piemonte, nell'apposita sezione Regione Piemonte FSC 2021-2027.

Per dare attuazione al Piano, con D.D. n. 192/A2102C/2025 del 31 luglio 2025 è stato affidato, a seguito di RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di comunicazione pluriennale integrata per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, annualità 2025- 2026 -2027, per un importo complessivo di euro 248.520,00 con l'obiettivo di definire l'immagine coordinata della comunicazione regionale, in coerenza con le linee guida nazionali, e di diffondere la conoscenza delle opportunità, dei primi risultati e dell'impatto che l'FSC ha nello sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del Piemonte, ponendo attenzione, nella comunicazione, anche all'integrazione strategica con altri Fondi, europei, nazionali e regionali.

L'attività è stata avviata, con la progettazione creativa dell'identità grafica della comunicazione del Fondo e con la declinazione specifica per l'ambito delle Aree Territoriali Omogenee (ATO), con la realizzazione di apposite linee guida da condividere con i beneficiari e gli attuatori.

Per quanto riguarda le ATO, sono stati realizzati un logo di ambito e 24 sue declinazioni, ciascuno afferente alle singole Aree Omogenee, e sono in corso di realizzazione i materiali informativi e divulgativi dei primi risultati.

Nell'ambito dell'Accordo per la Coesione, settore di intervento "Attività culturali" (Assegnazione in anticipazione), è stato promosso un intervento di recupero finalizzato alla riapertura del Museo Regionale di Scienze Naturali, che viene qui brevemente illustrato come **progetto esemplare**.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino rappresenta una risorsa culturale di grande rilievo collocata nel cuore della città, all'interno di un edificio di prestigio progettato da Amedeo di Castellamonte, già sede dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città di Torino. Istituito con legge regionale nel 1978, il Museo è articolato in cinque sezioni scientifiche (botanica, entomologia, mineralogia-petrografia-geologia, paleontologia e zoologia), cui si affianca la sezione didattica e la biblioteca, ricca di circa 20.000 volumi, tra cui un fondo antico di grande valore. Sede di spazi espositivi permanenti, rinnovati nel 2024, nel tempo ha ospitato numerose mostre temporanee e ha realizzato mostre itineranti allestite sia sul territorio nazionale che internazionale.

Il Reparto di Conservazione e Ricerca raccoglie in comodato d'uso le preziose collezioni di storia naturale dell'Università di Torino, costituite tra il XVIII e il XIX secolo, insieme a numerose collezioni naturalistiche più recenti acquisite dalla Regione Piemonte. Tra queste si distinguono, per il loro valore scientifico, migliaia di esemplari tipici, ossia individui su cui è stata descritta una nuova specie. Accanto all'attività di conservazione delle collezioni, il Museo svolge una significativa attività di ricerca, di didattica, divulgazione e promozione culturale, rendendolo un'apprezzata meta turistica per il pubblico scolastico, per le famiglie e gli utenti in genere.

Il Museo, rimasto chiuso al pubblico per un lungo periodo per lavori di ristrutturazione e ripristino a seguito dell'esplosione del sistema antincendio verificatosi nell'agosto 2013, ha proseguito tuttavia regolarmente le attività principali della propria missione, quali la didattica, proponendo laboratori presso i plessi scolastici o on-line, la realizzazione di mostre itineranti, la catalogazione delle collezioni, la ricerca in campo.

Tra il 2015 e il 2019 si sono susseguite diverse fasi di interventi di natura impiantistica ed edile finanziati con fondi regionali che hanno coinvolto gli spazi al piano terreno e interrato al fine di renderli agibili al personale regionale e al pubblico. Dal 2020, grazie a 3 importanti finanziamenti statali, sono proseguiti i lavori di ripristino degli impianti e messa in sicurezza dell'edificio finalizzati al recupero dell'intera struttura sia per qual che riguarda le aree espositive, sia quelle dedicate ai depositi delle collezioni.

Nel 2021 la Giunta regionale ha deliberato gli "Indirizzi per la realizzazione degli interventi di completamento, mirati alla riapertura al pubblico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino", al fine di restituire funzionalità complessiva all'edificio che ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali, anche in ragione dell'acquisizione della proprietà dell'immobile sede dello stesso e della chiesa e relativa sacrestia facenti parte del complesso storico dell'antico Ospedale di San Giovanni Battista.

In attuazione di tali indirizzi, nel marzo 2022 l'amministrazione regionale ha affidato a SCR Piemonte S.p.A. (partner strategico della Regione nel sistema degli appalti) la redazione di uno studio di fattibilità, corredato di un cronoprogramma tecnico-finanziario, finalizzato all'apertura delle aree museali destinate all'accesso del pubblico nonché alla messa in sicurezza dell'edificio. In particolare, oltre ad affidare a SCR le funzioni di centrale di committenza e stazione unica appaltante, l'incarico prevedeva la definizione, in via indicativa, di un ambizioso programma di intervento complessivo, articolato nelle seguenti fasi attuative:

- FASE 1: apertura al pubblico delle aree al piano terreno oltre ai piani uffici e biblioteca già aperti al solo personale del Museo;
- FASE 2: apertura dei locali "depositi" che necessitavano di interventi per la messa in sicurezza, allestimento cortili, nuovi allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata al Piano Terreno;
- FASE 3: apertura al pubblico delle aree al piano interrato;
- FASE 4: apertura al pubblico del secondo piano;
- FASE 5: lavori ed allestimento della Chiesa e delle Sacrestia dell'antico Ospedale di San Giovanni Battista.

L'elaborazione del progetto fattibilità tecnico economica ha tuttavia evidenziato, per quanto concerne la Fase 1 (apertura integrale del piano terreno), l'esigenza di interventi di particolare complessità, a causa dell'emergere delle interrelazioni tra le varie componenti del fabbricato, nonché del necessario coordinamento e armonizzazione con la "progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine coordinata del museo regionale di scienze naturali", in capo al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali. Nell'ottica di definire un percorso per la progressiva riapertura al pubblico del Museo, si è pertanto optato per rimodulare temporalmente la prima fase, avviando le attività volte a rendere visitabili e fruibili le aree museali conosciute come "Museo Storico di Zoologia", "Arca" ed "Esposizione Temporanea - Sala delle Meraviglie" e a rifunzionalizzare nel contempo l'accesso su Via Accademia Albertina (DGR n. 58-6404 del 28/12/2022). In attuazione di tale scelta - in massima parte finanziata con risorse FSC (1,7 milioni di €) riservando ai fondi regionali l'onere delle spese di allestimento - nel mese di agosto 2023 sono stati affidati i lavori che hanno permesso, nel gennaio 2024, la riapertura al pubblico delle tre aree sopra richiamate. Nel dettaglio:

- il Museo Storico di Zoologia in cui sono presenti esemplari naturalizzati e scheletri provenienti dalle collezioni storiche dell'Università di Torino, integrate da reperti recenti; gli animali esposti, di grande valore naturalistico e storico, sono suddivisi in base alla rispettiva area geografica di provenienza, proponendo una sorta di giro ideale intorno al mondo;
- l'Arca che propone un percorso attraverso i viaggi naturalistici del passato e del presente che hanno portato le collezioni in Museo, con al centro la splendida struttura in ferro e lignea a sostegno dello scheletro di balenottera spiaggiata a Bordighera (IM) a metà Ottocento;
- l'Esposizione Temporanea "Sala delle Meraviglie" in cui si propongono gli scheletri del Rinoceronte di Dusino e del Mastodonte, una selezione dei minerali esteticamente più significativi delle collezioni mineralogiche del Museo, due vetrine storiche con lepidotteri e coleotteri e fogli d'erbario di valenza artistica.

Il programma di lavori previsto dal progetto di fattibilità tecnico amministrativa è in corso di svolgimento e condurrà all'apertura, prevista per la fine del 2026, delle sale espositive del piano terreno presenti nella manica est della crociera e suo soppalco e nell'ala su via San Massimo con relativo soppalco dedicata al Madagascar. Per raggiungere tale obiettivo nel 2024 sono state affidate le attività di progettazione esecutiva ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, conclusasi nel mese di dicembre dello stesso anno con l'individuazione della Ditta Appaltatrice. Le risorse economiche necessarie per tale operazione ammontano a € 3.800.000 e trovano copertura nei fondi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 51-5212 "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Presa d'atto interventi finanziati con anticipazione delle risorse di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021".

Nelle precedenti relazioni semestrali sono stati presentati i seguenti progetti esemplari:

Relazione semestrale 30/06/2025 - AREA TEMATICA: ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SETTORE DI INTERVENTO: EDUCAZIONE E FORMAZIONE - Misura dedicata al consolidamento delle Accademie di filiera;

Relazione semestrale 31/12/2024 - AREA TEMATICA: RIQUALIFICAZIONE URBANA - SETTORE DI INTERVENTO: EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI - STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA
