



*fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020*

*FONDO SOCIALE EUROPEO e FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE*

# **Il Piano di Rafforzamento Amministrativo del Piemonte**

***Davide Donati***

*Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale  
Struttura temporanea "Piano di rafforzamento Amministrativo"*



*FESR e FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte*  
[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

# Il PRA della Regione Piemonte in una pagina

Il PRA della Regione Piemonte è stato approvato il **22 dicembre 2014 con DGR 776/2014**

Predisposto sulla base dell'**analisi diagnostica** del periodo di programmazione 2007-2013 e dei **target di miglioramento** individuati insieme alla CE

Consta di **43 azioni** da realizzarsi entro il 31 dicembre 2016, sulla base di milestones semestrali e annuali.

Sottoposto a **monitoraggio quadrimestrale**, **relazione annuale d'implementazione** e **valutazione finale indipendente**

# La diagnosi

Dai precedenti cicli di programmazione emergono conferme relativamente al sistema organizzativo e procedurale, la cui performance è risultata positiva, come dimostrato anche dal rispetto dei target di spesa.

Sono stati tuttavia identificati spazi di miglioramento per quanto riguarda la qualità della spesa e l'azione dell'amministrazione, nei seguenti ambiti:

- Rafforzamento dell'integrazione tra i Programmi
- Riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari
- Rafforzamento quali-quantitativo del Si.Ge.Co.
- Rafforzamento del presidio delle policies complesse (S3, ricerca, energia, sviluppo locale) e delle normative procedurali (aiuti di stato, appalti)
- Recuperi di efficienza e miglioramento delle tempistiche tramite azioni di riorganizzazione strutturale e procedurale
- Miglioramento, anche in termini di interoperabilità, dei sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio e dematerializzazione

# La metodologia

Come emerge chiaramente dal catalogo degli ambiti di intervento appena descritti, l'implementazione del PRA del Piemonte è un esercizio complesso che coinvolge, oltre al Responsabile, alle strutture del Si.Ge.Co. e quelle direttamente o indirettamente interessate dalla programmazione dei Fondi SIE, l'insieme delle funzioni strategiche dell'Ente.

La metodologia attivata si fonda pertanto sui seguenti capisaldi:

- **Comitato tecnico di supporto alla Cabina di Regia per i Fondi SIE**: *condivisione delle linee strategiche per la predisposizione e attuazione del PRA*
- **Responsabile del PRA**: *monitoraggio e regia dell'attuazione del Piano, tramite Struttura temporanea "Piano di rafforzamento Amministrativo", appositamente istituita*
- **Strutture regionali**: *responsabili dell'attuazione dei singoli interventi*

Al fine di consapevolizzare maggiormente le strutture rispetto all'importanza del PRA ed elevare il grado di affidabilità delle responsabilità periferiche dell'implementazione, numerosi interventi sono stati inseriti come obiettivi dei piani di lavoro di dirigenti e funzionari delle strutture coinvolte.

# Lo stato di avanzamento del PRA

Sono 43 le azioni in corso di implementazione, afferenti alle aree appena descritte, che saranno portate a compimento entro il 2016.


Siamo in grado di dar conto dello stato di realizzazione del PRA con dati aggiornati al 30 aprile 2016.

Sono state completate 26 azioni delle 43 previste, con una percentuale di realizzazione complessiva del PRA del 65%.


Il rispetto delle scadenze si attesta ad un livello molto soddisfacente, 85% e dove si rilevano ritardi questi sono comunque contenuti. Il ritardo ancora presente concerne soltanto 6 azioni (scadenza 31/12/2015), che risultano tuttavia essere in stadio avanzato di realizzazione.

I dati relativi ai due fondi evidenziano un andamento sostanzialmente simile (risultano completate il 73% delle 29 azioni relative al FSE e il 58% delle 33 azioni che riguardano il FESR, mentre in merito a quelle completate entro la scadenza, le azioni FSE sono al 95% e quelle FESR al 71%).

# Gli interventi: ripartizione ambiti

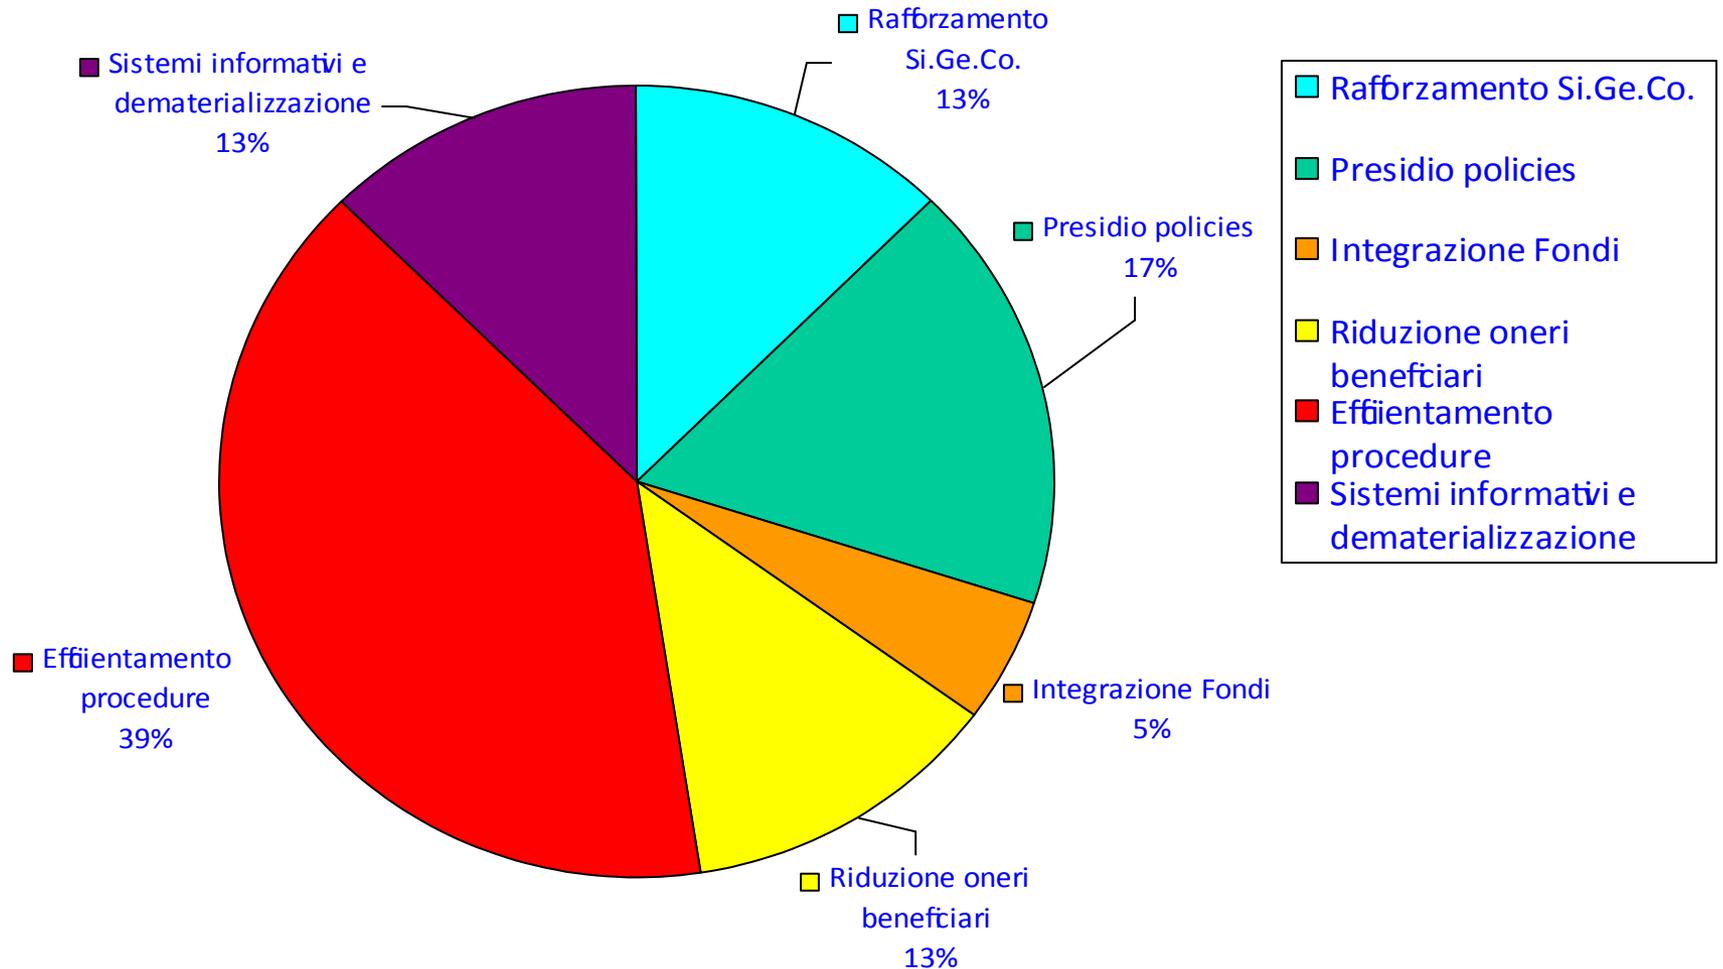

# Gli interventi: grado di completamento

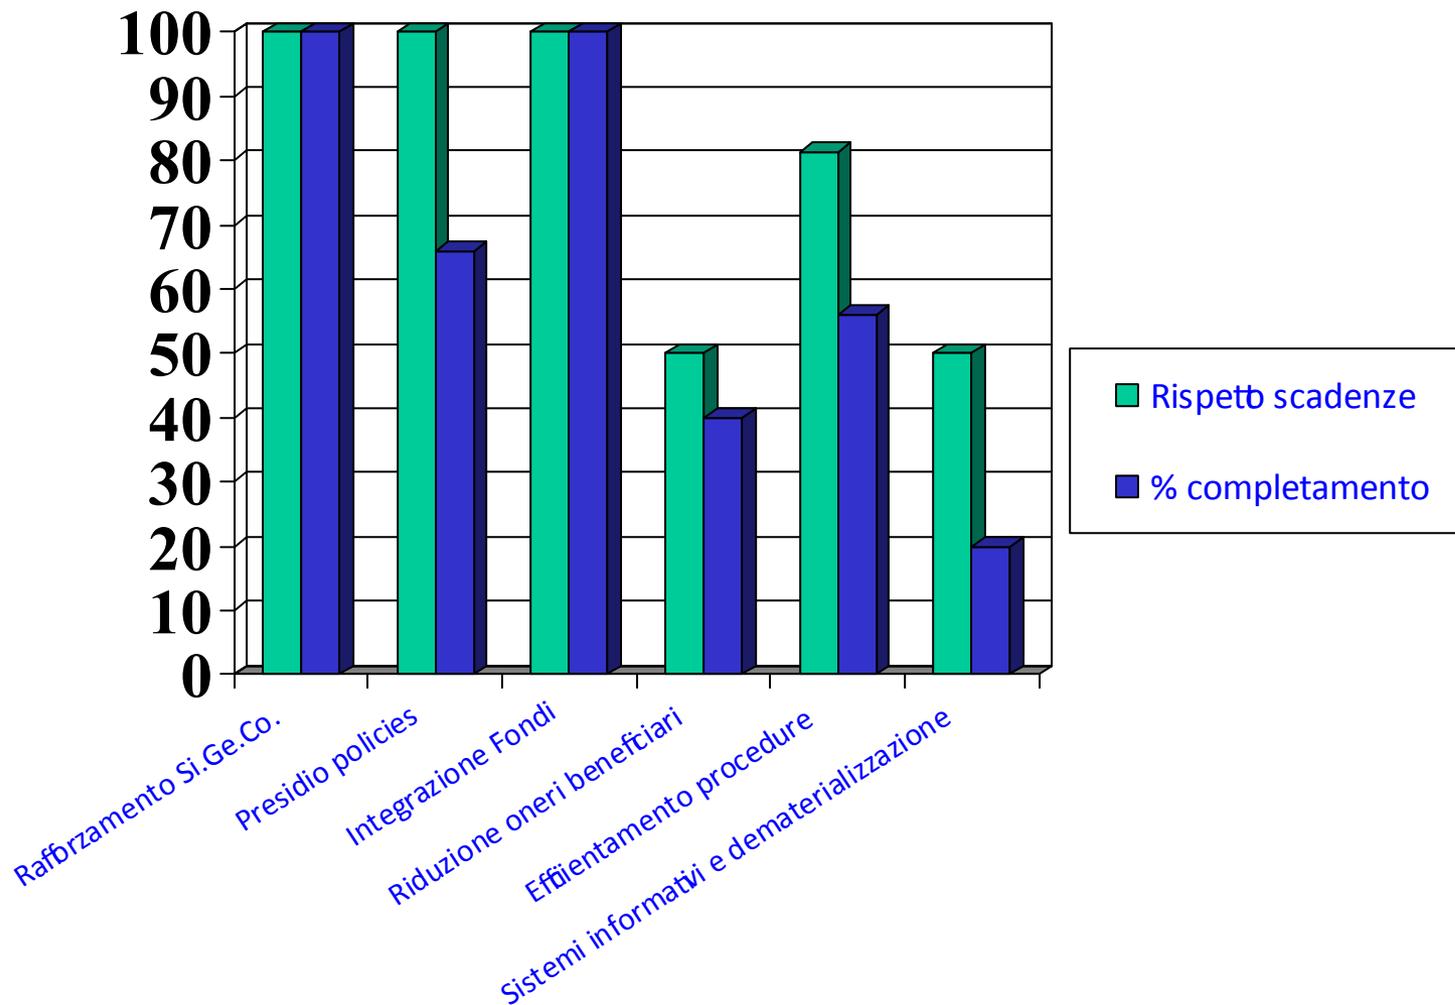

# Le azioni (1)

Tra tutti gli interventi precedentemente illustrati, i seguenti sono già stati implementati nel 2015 o lo saranno nel corso del 2016 e, in particolare:

Misura	Scadenza	Stato di attuazione
Portale web unico dedicato al periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi SIE	Settembre 2014	
Attivazione di un Comitato di Sorveglianza unitario per i Fondi FESR e FSE	Giugno 2015	
Analisi di un modello unico di domanda, secondo le esigenze dei singoli fondi	Giugno 2015	
Introduzione di una programmazione dei flussi di cassa da parte della Ragioneria centrale e la previsione di una "fast track" a favore dei PO	Giugno 2015	
Potenziamento della possibilità di attribuzione del personale alle strutture coinvolte nel Si.Ge.Co. + NUVAL + A.A.	Giugno 2015	

# Le azioni (2)

Misura	Scadenza	Stato di attuazione
<b>Potenziamento della dotazione di personale delle strutture coinvolte nel Si.Ge.Co. + NUVAL + A.A.</b>		
• Ricognizione, sulla base dell'attuale consistenza della forza lavoro impiegata, delle risorse che devono essere implementate	Giugno 2015	
• Definizione di un piano di potenziamento articolato nel tempo	Giugno 2015	
<b>Rafforzamento delle competenze del personale regionale coinvolto nel Si.Ge.Co. + NUVAL + A.A.</b>		
• Azioni di rilevazione puntuale dei fabbisogni formativi specifici presso le strutture coinvolte	Dicembre 2015	
• Realizzazione di iniziative finalizzate a garantire un livello omogeneo di base, da realizzarsi con istituzioni universitarie, istituti e centri di studi, e iniziative di aggiornamento	Dicembre 2015	
• Azioni di formazione mirata e specifica per il nuovo personale inserito nelle strutture	dall'inserimento del personale	
Standardizzazione dei bandi (FESR)	Dicembre 2015	
Standardizzazione atti di indirizzo (FSE)	Dicembre 2015	

# Le azioni (3)

Misura	Scadenza	Stato di attuazione
Modifica delle procedure di accesso ai contributi attraverso un processo valutativo/negoziabile	Dicembre 2015	
Semplificazione della governance e monitoraggio degli interventi relativi alla S3	Dicembre 2015	
Informatizzazione del modello di domanda di finanziamento	Dicembre 2015	
Interventi di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi	Dicembre 2015	
Diffusione ai beneficiari degli strumenti di controllo utilizzati dall'AdG	Dicembre 2015	
Predisposizione di una Guida per gli appalti sotto soglia europea a favore dei beneficiari e del personale coinvolto	Dicembre 2015	
Rafforzamento del presidio relativo all'applicazione della normativa europea in materia di Aiuti di stato: <b>accentramento delle relative competenze presso un'unica struttura regionale in posizione di indipendenza rispetto alle strutture erogatrici</b>	Dicembre 2015	
Rafforzamento del presidio relativo all'applicazione della normativa europea in materia di Aiuti di Stato: <b>predisposizione di uno specifico piano di formazione a beneficio del personale coinvolto dall'implementazione della programmazione dei fondi SIE</b>	Dicembre 2015	

# Le azioni 2015 (4)

Misura	Scadenza	Stato di attuazione
Rafforzamento del presidio relativo all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici: <b>predisposizione di uno specifico piano di formazione a beneficio del personale coinvolto dall'implementazione della programmazione dei fondi SIE</b>	Dicembre 2015	
Implementazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017	Dicembre 2015	
Definizione e approvazione di un metodo di valutazione della capacità degli OI e dei beneficiari	Dicembre 2015	
Introduzione della prescrittività dei termini previsti da AdG/OI articolandoli in cronoprogrammi	Ottobre 2016	
Introduzione della coerenza dei cronoprogrammi presentati dai beneficiari	Ottobre 2016	
Razionalizzazione del ruolo dei diversi soggetti gestori all'interno dei poli di Innovazione e definizione scadenze per l'espletamento dei compiti degli esperti tecnici	Dicembre 2016	
Revisione della convenzione con CSI	Dicembre 2016	
Revisione della convenzione con Finpiemonte	Dicembre 2016	

# Il partenariato

Il PRA non ha e non può avere esclusiva rilevanza interna all'Amministrazione, ma dispiega i suoi effetti essenzialmente all'esterno, verso organismi intermedi e beneficiari in primo luogo, ma anche nei confronti dell'insieme degli *stakeholders* e del partenariato regionale.

Per questo motivo è indispensabile mantenere attivo un interscambio continuo tra la Regione e il proprio partenariato nel corso dell'implementazione del Piano. A tal fine il PRA è pubblicato nell'area dedicata al partenariato 2014-2020 del sito regionale.

<http://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/>

Inoltre, nell'ambito di una collaborazione tra Confindustria e Conferenza delle Regioni, è stato organizzato, lo scorso 28 settembre 2015 a Torino un convegno rivolto alle Regioni del Nord Italia, dal titolo "I Piani di Rafforzamento Amministrativo delle Regioni e la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020", che ha rappresentato un'utile occasione per comunicare al territorio natura e finalità del PRA e modalità della sua implementazione.

# Grazie per l'attenzione!



*FSE e FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Pie*

